


اجرای طرح شمع

پروژه ۸۴ و ۲۱ واحدی مسکن ملی داراب


هر متقاضی بر اساس رتبه خود، نام و موقعیت بلوک متعلق به خود را
تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ (با شاخص‌های موقت) مشاهده فرماید.




MOHAMMAD HOSSEIN
FIROUZI

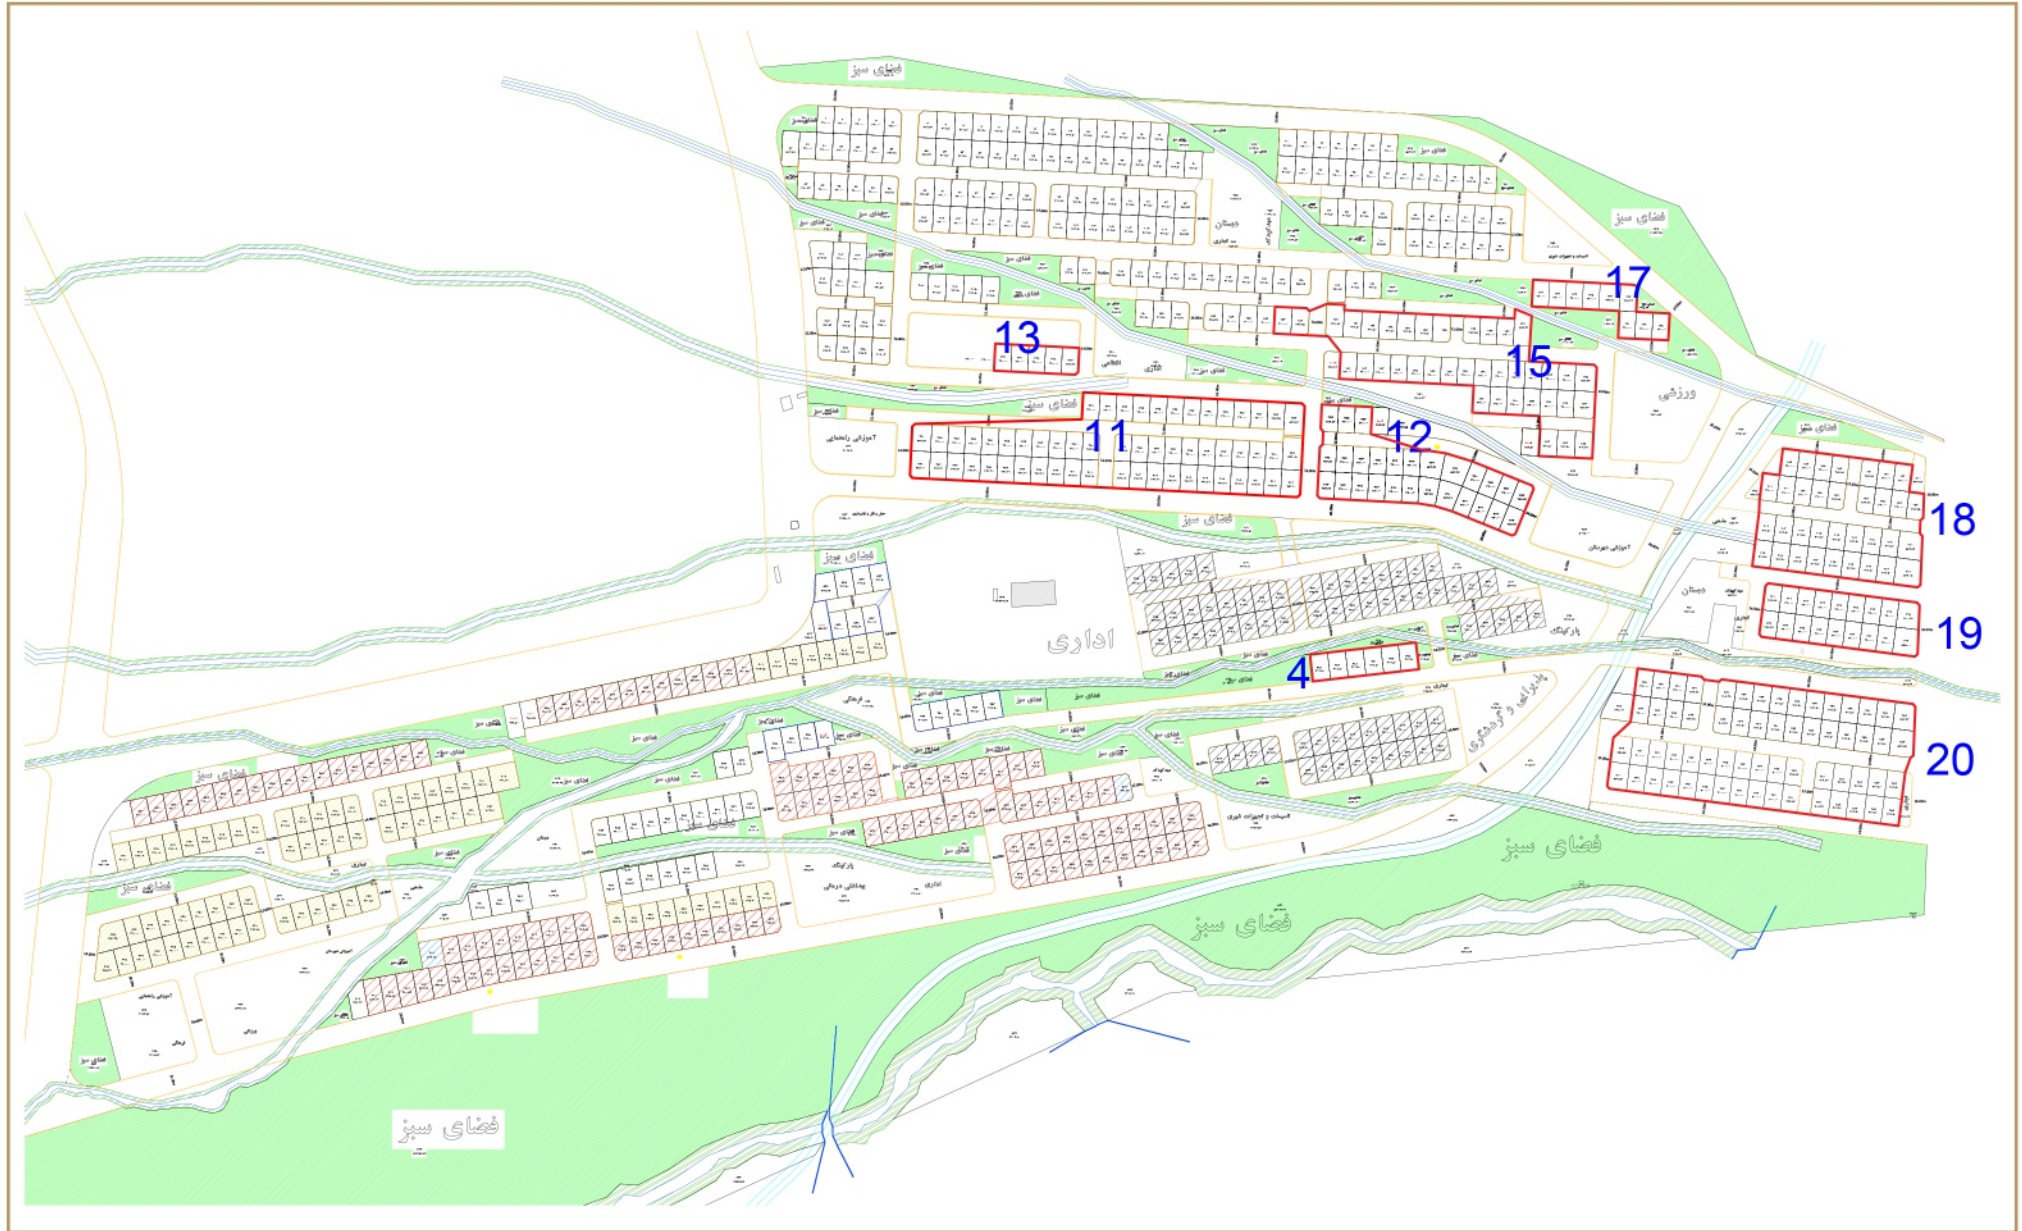


نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۱۳۸۴ واحدی

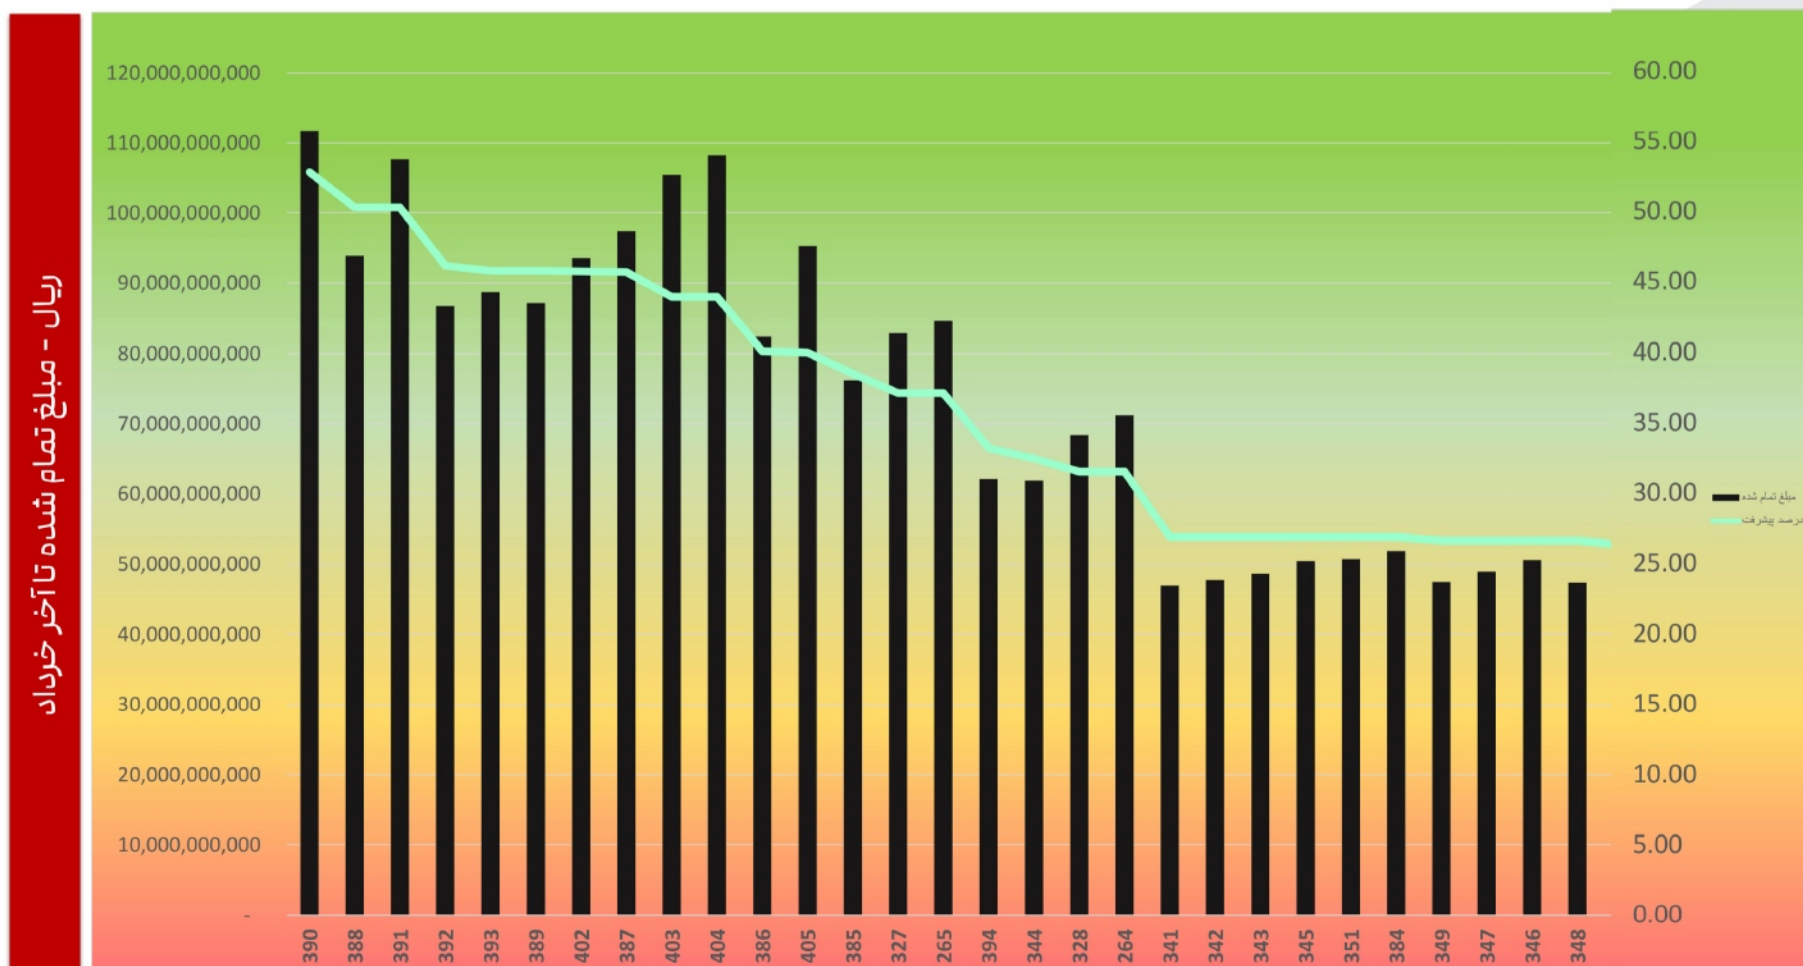


نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۱۳۸۴ واحدی

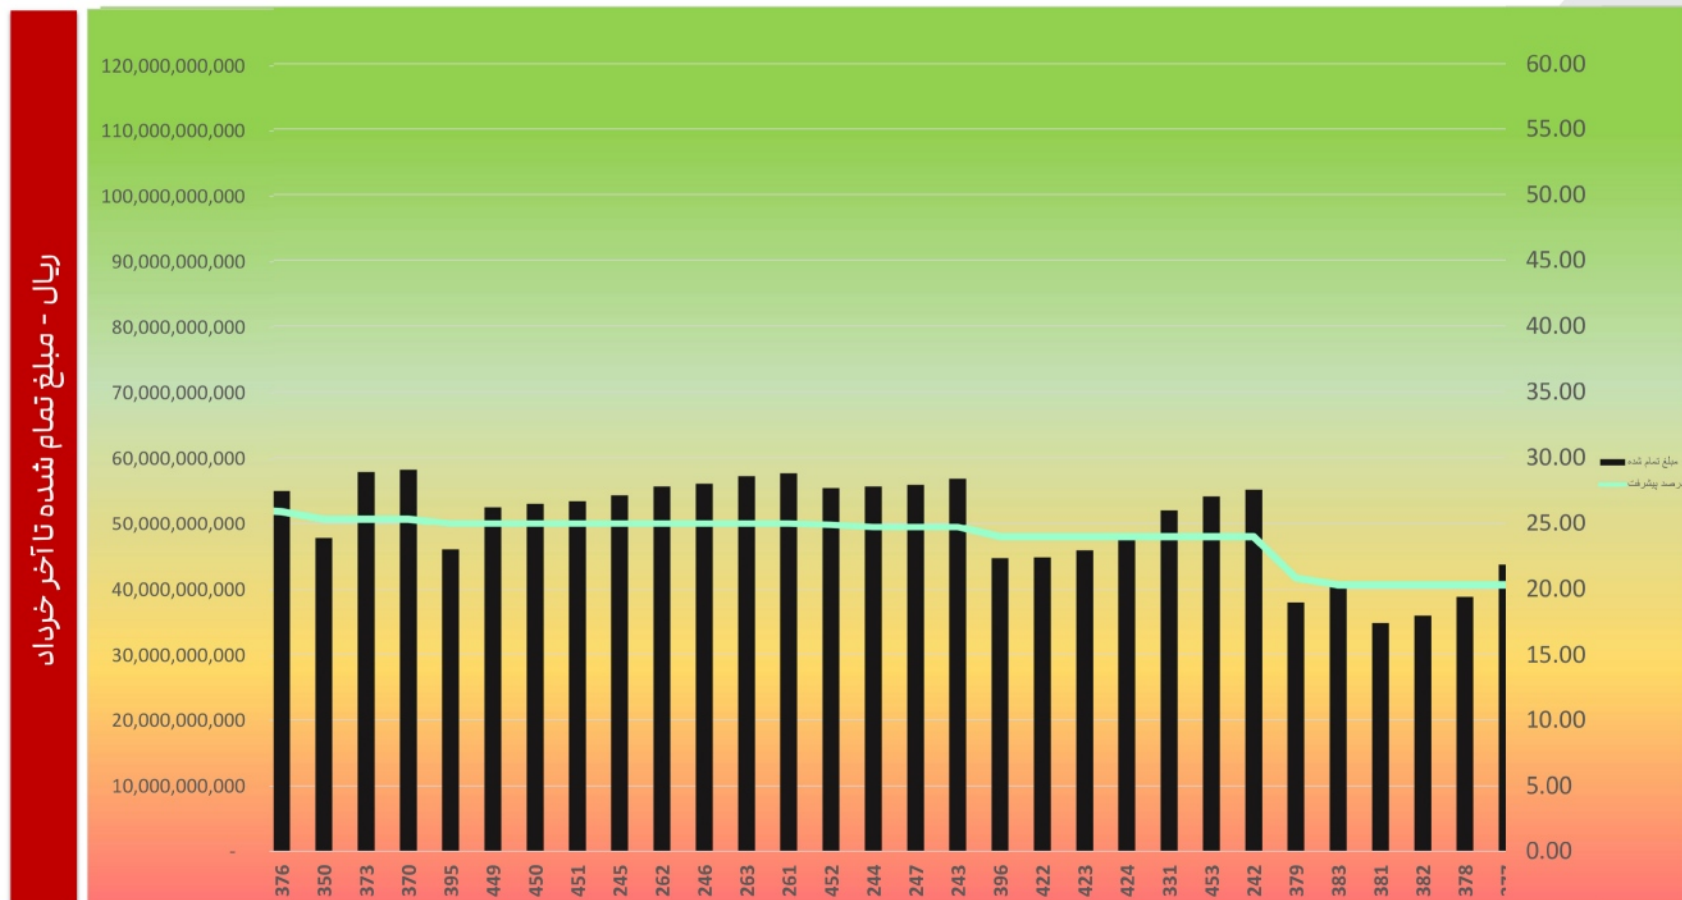


نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۱۳۸۴ واحدی

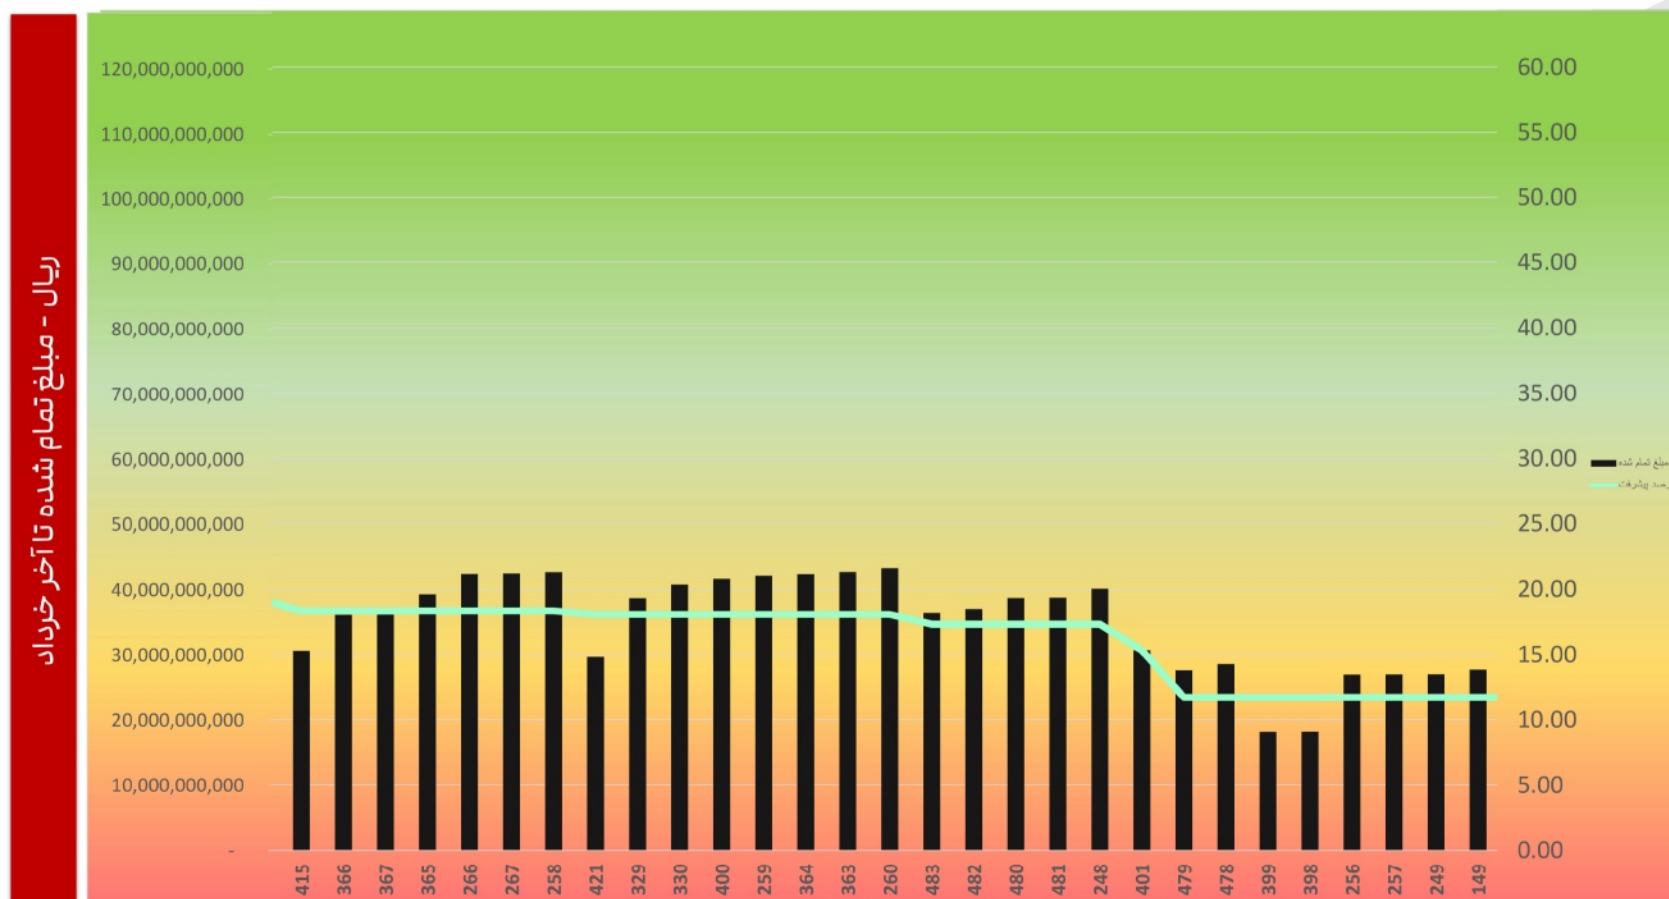


نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۱۳۸۴ واحدی

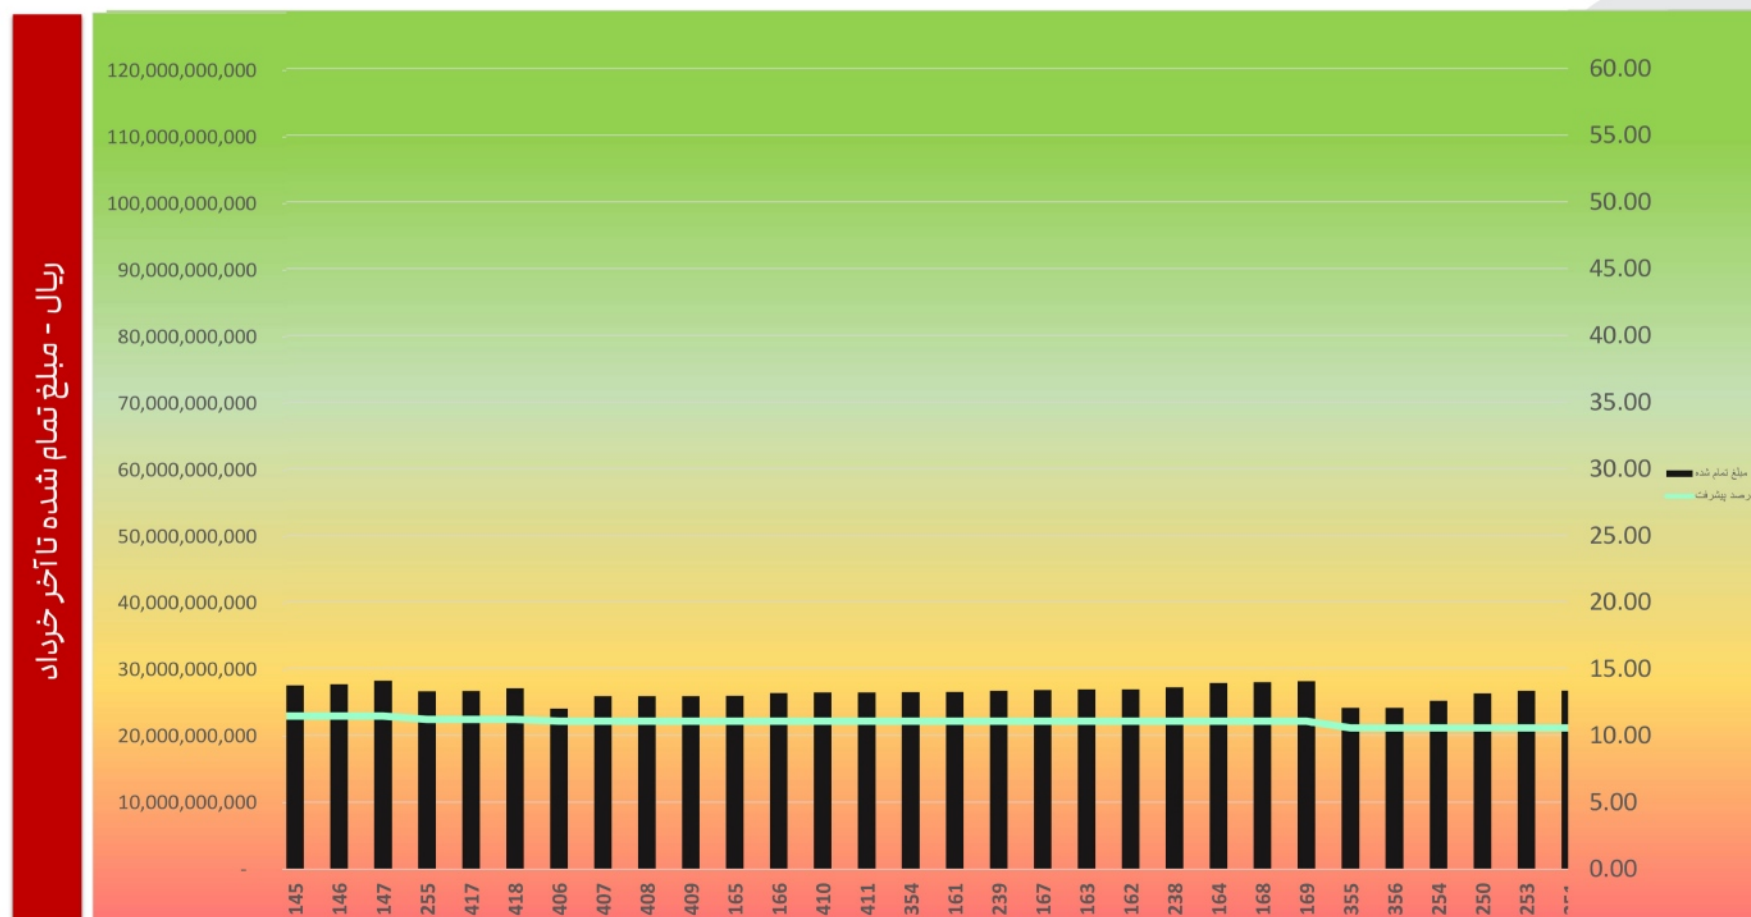


نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۱۳۸۴ واحدی

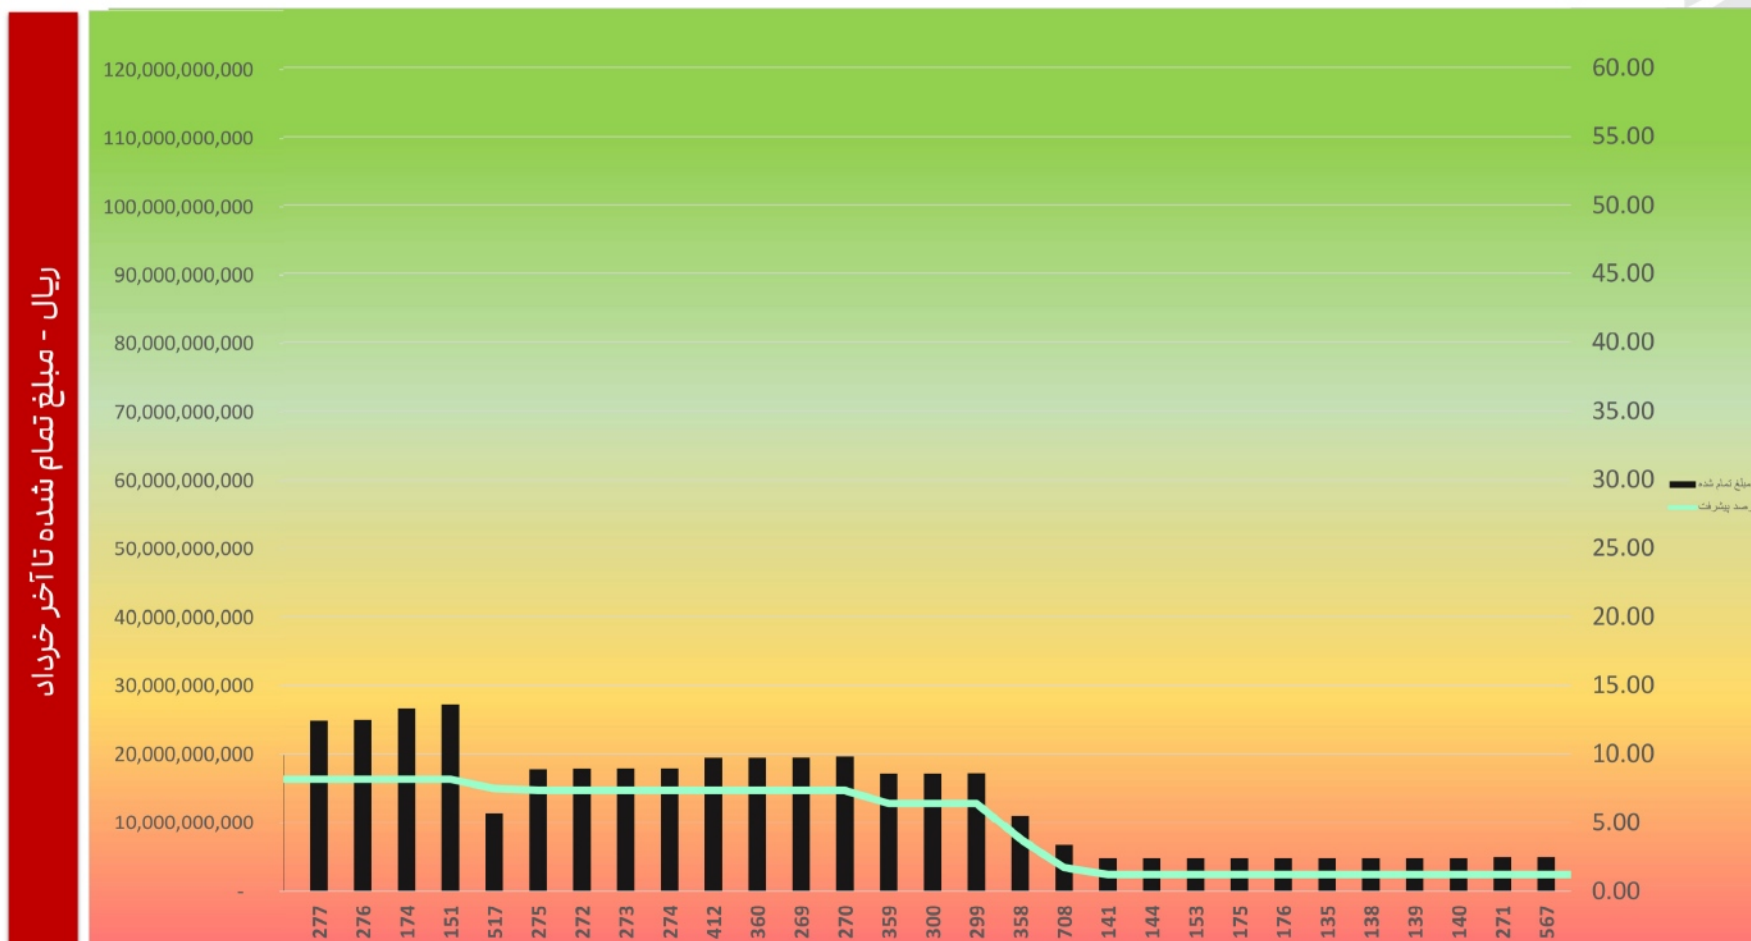

نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۱۳۸۴ واحدی

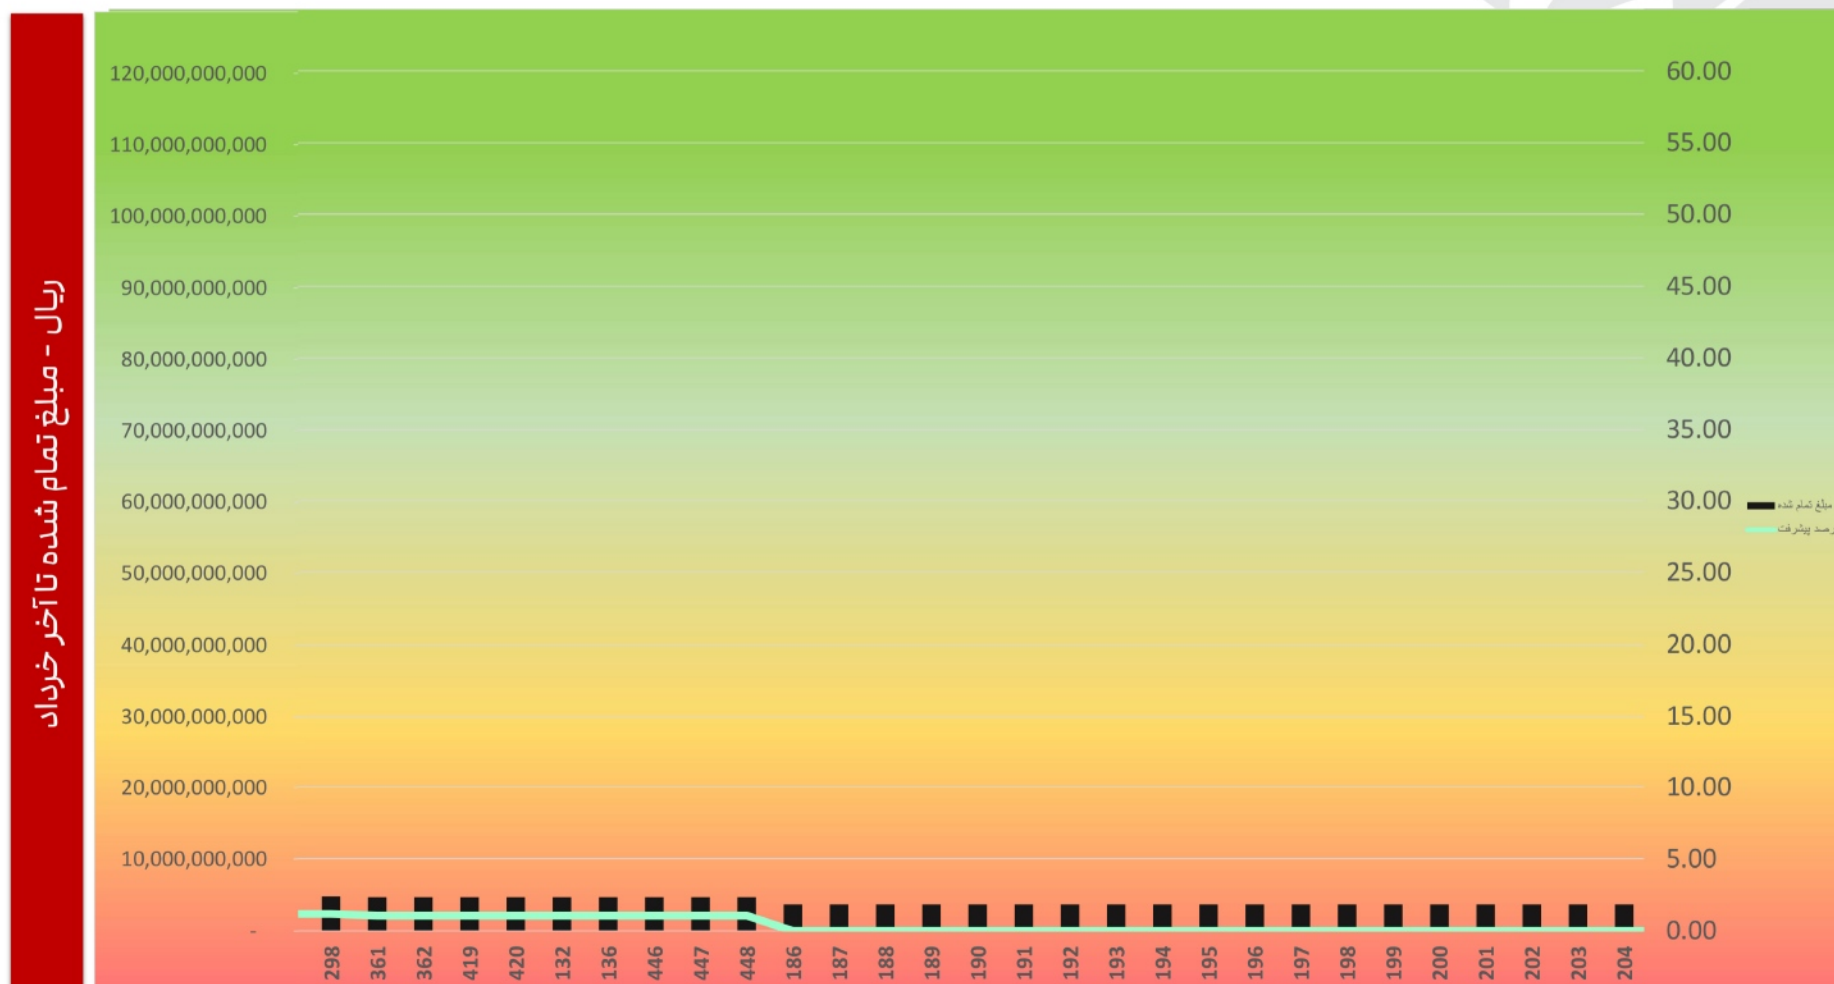

نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۱۲۸۴ واحدی

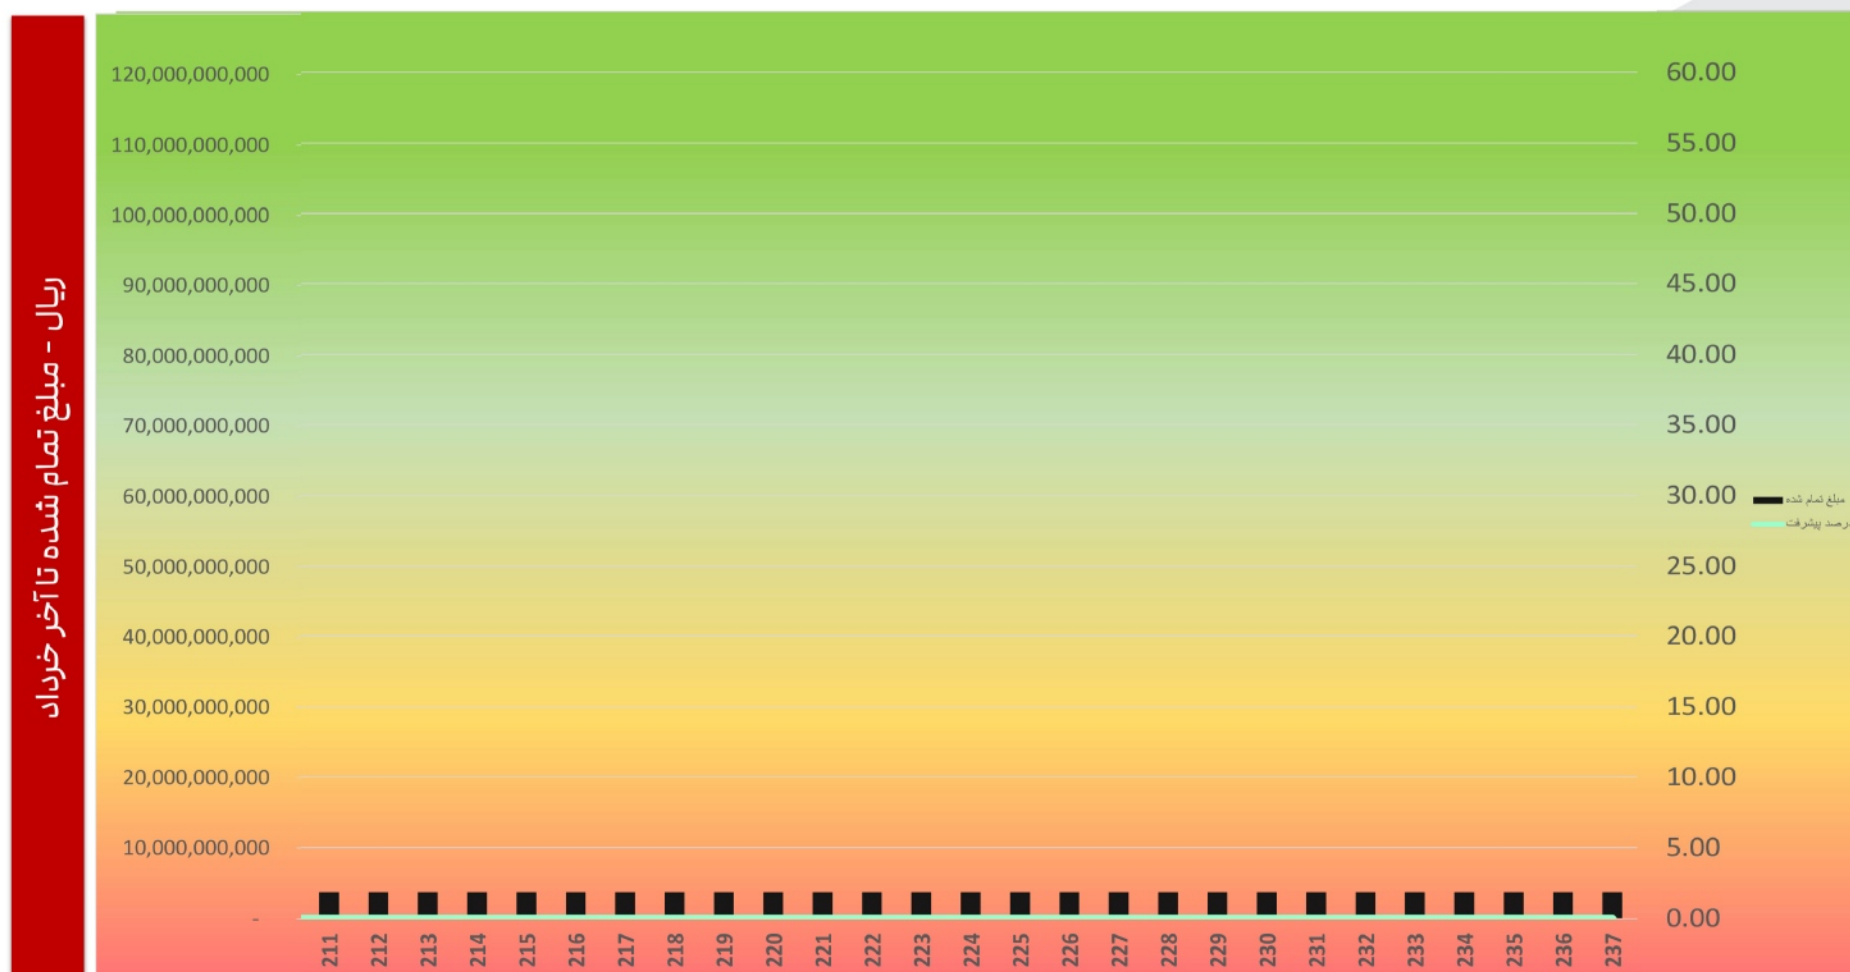

گزارش هزینه کرد هر بلوک تا پایان خرداد ۱۴۰۵

توجه : مبالغ تمام شده با توجه به شاخص های قطعی تعدیل تغییر می کنند!

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
11	390	8	52.91	112,702,629,546	14,087,828,693	اسکلت تکمیل شده	والیست کامل دیوارچینی طبقه دوم	1	8
11	388	8	50.39	94,812,673,390	11,851,584,174	اسکلت تکمیل شده	والیست طبقه سوم دیوارچینی طبقه همکف	9	16
11	391	8	50.39	108,581,232,837	13,572,654,105	اسکلت تکمیل شده	والیست طبقه سوم دیوارچینی طبقه همکف	17	24
11	392	8	46.23	87,651,139,067	10,956,392,383	اسکلت تکمیل شده	دیوارچینی طبقه همکف والیست اول	25	32
11	393	8	45.87	89,646,958,817	11,205,869,852	اسکلت تکمیل شده	دیوارچینی طبقه همکف	33	40
11	389	8	45.87	88,098,691,005	11,012,336,376	عمل آوری بتن ستون خربشته	دیوارچینی طبقه همکف	41	48
11	402	8	45.83	94,193,992,372	11,774,249,046	آرماتوربندی ستون خربشته	دیوارچینی طبقه همکف	49	56
11	387	8	45.78	98,303,626,081	12,287,953,260	عمل آوری بتن سقف طبقه چهارم	دیوارچینی طبقه همکف	57	64
11	403	8	44.02	96,717,042,939	12,089,630,367	آرماتوربندی ستون خربشته سقف چهارم تا نیمه	دیوارچینی طبقه همکف	65	72
11	404	8	44.02	99,548,686,786	12,443,585,848	آرماتوربندی ستون خربشته سقف چهارم تا نیمه	دیوارچینی طبقه همکف	73	80
11	386	8	40.18	83,300,320,466	10,412,540,058	عمل آوری بتن ستون طبقه چهارم	دیوارچینی طبقه همکف	81	88
11	405	8	40.08	90,735,214,046	11,341,901,756	قالب بندی ستون طبقه چهارم	دیوارچینی طبقه همکف	89	96
11	385	8	38.58	77,149,567,838	9,643,695,980	عمل آوری بتن سقف طبقه سوم	والیست همکف	97	104
13	327	8	37.20	83,776,764,749	10,472,095,594	عمل آوری بتن سقف طبقه سوم		105	112
20	265	8	37.20	85,569,546,276	10,696,193,285	عمل آوری بتن سقف طبقه سوم		113	120
11	394	8	33.28	63,087,129,781	7,885,891,223	آرماتوربندی ستون طبقه سوم	دیوارچینی طبقه همکف	121	128
11	344	8	32.52	62,828,797,418	7,853,599,677	عمل آوری بتن سقف طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	129	136
13	328	8	31.60	69,313,246,091	8,664,155,761	عمل آوری بتن ستون طبقه سوم		137	144
20	264	8	31.60	72,170,684,038	9,021,335,505	عمل آوری بتن ستون طبقه سوم		145	152
11	341	8	26.92	47,794,979,804	5,974,372,475	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	153	160
11	342	8	26.92	48,731,653,683	6,091,456,710	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	161	168
11	343	8	26.92	49,583,645,758	6,197,955,720	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	169	176
11	345	8	26.92	51,387,806,661	6,423,475,833	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	177	184
11	351	8	26.92	51,658,098,697	6,457,262,337	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	185	192

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
11	384	8	26.92	52,816,766,083	6,602,095,760	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	193	200
11	349	8	26.66	48,332,767,764	6,041,595,970	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	201	208
11	347	8	26.66	49,887,004,520	6,235,875,565	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	209	216
11	346	8	26.66	51,530,830,337	6,441,353,792	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	217	224
11	348	8	26.66	48,228,244,901	6,028,530,613	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	225	232
11	352	8	26.35	52,117,035,884	6,514,629,486	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	والیست همکف	233	240
11	353	8	26.35	58,217,266,627	7,277,158,328	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	والیست همکف	241	248
11	369	8	26.09	59,156,332,282	7,394,541,535	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	والیست همکف	249	256
11	374	8	26.09	60,406,347,444	7,550,793,430	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	والیست همکف	257	264
11	376	8	25.90	55,865,360,196	6,983,170,024	عمل آوری بتن سقف طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	265	272
11	350	8	25.33	48,635,301,500	6,079,412,688	عمل آوری بتن سقف طبقه اول	والیست همکف	273	280
11	373	8	25.33	58,744,391,657	7,343,048,957	عمل آوری بتن سقف طبقه اول	والیست همکف	281	288
11	370	8	25.33	59,091,444,276	7,386,430,535	عمل آوری بتن سقف طبقه اول	والیست همکف	289	296
11	395	8	24.97	46,876,787,790	5,859,598,474	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		297	304
0	449	8	24.97	53,364,333,270	6,670,541,659	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		305	312
0	450	8	24.97	53,943,512,215	6,742,939,027	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		313	320
0	451	8	24.97	54,333,137,851	6,791,642,231	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		321	328
20	245	8	24.97	55,229,472,249	6,903,684,031	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		329	336
20	262	8	24.97	56,535,206,666	7,066,900,833	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		337	344
20	246	8	24.97	56,958,899,037	7,119,862,380	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		345	352
20	263	8	24.97	58,133,252,553	7,266,656,569	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		353	360
20	261	8	24.97	58,566,395,947	7,320,799,493	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		361	368
0	452	8	24.87	56,312,691,222	7,039,086,403	قالب بندی ستون طبقه دوم		369	376
20	244	8	24.70	56,540,300,041	7,067,537,505	آرماتوربندی ستون طبقه دوم		377	384



زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
20	247	8	24.70	56,777,938,223	7,097,242,278	آرماتوربندی ستون طبقه دوم		385	392
20	243	8	24.70	57,739,520,029	7,217,440,004	آرماتوربندی ستون طبقه دوم		393	400
11	396	8	23.94	45,551,988,931	5,693,998,616	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		401	408
12	422	8	23.94	45,688,045,766	5,711,005,721	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		409	416
12	423	8	23.94	46,747,702,235	5,843,462,779	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		417	424
12	424	8	23.94	48,722,544,051	6,090,318,006	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		425	432
13	331	8	23.94	52,908,812,326	6,613,601,541	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		433	440
0	453	8	23.94	55,049,844,339	6,881,230,542	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		441	448
20	242	8	23.94	56,059,580,906	7,007,447,613	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		449	456
11	379	8	20.80	38,876,355,920	4,859,544,490	قالب بندی تیرها سقف طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	457	464
11	383	8	20.30	41,563,049,317	5,195,381,165	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	465	472
11	381	8	20.30	35,763,324,000	4,470,415,500	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	473	480
11	382	8	20.30	36,875,916,783	4,609,489,598	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	481	488
11	378	8	20.30	39,731,013,264	4,966,376,658	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	489	496
11	377	8	20.30	44,608,980,515	5,576,122,564	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	497	504
11	380	8	19.73	40,146,282,728	5,018,285,341	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	505	512
12	414	8	19.73	32,239,353,122	4,029,919,140	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	513	520
12	368	8	19.73	42,418,016,195	5,302,252,024	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	521	528
11	372	8	19.73	45,289,584,199	5,661,198,025	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	529	536
11	371	8	19.73	45,833,447,677	5,729,180,960	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	537	544
11	375	8	19.27	43,061,163,779	5,382,645,472	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف	دیوارچینی طبقه همکف	545	552
12	415	8	18.34	31,537,354,238	3,942,169,280	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		553	560
12	366	8	18.34	36,991,615,891	4,623,951,986	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		561	568
12	367	8	18.34	37,011,142,514	4,626,392,814	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		569	576

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
12	365	8	18.34	40,125,319,244	5,015,664,906	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		577	584
20	266	8	18.34	43,235,158,772	5,404,394,846	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		585	592
20	267	8	18.34	43,297,638,319	5,412,204,790	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		593	600
20	258	8	18.34	43,503,602,433	5,437,950,304	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		601	608
12	421	8	18.07	30,544,283,795	3,818,035,474	آرماتوربندی ستون طبقه اول		609	616
13	329	8	18.07	39,548,595,261	4,943,574,408	آرماتوربندی ستون طبقه اول		617	624
13	330	8	18.07	41,643,635,467	5,205,454,433	آرماتوربندی ستون طبقه اول		625	632
11	400	8	18.07	42,508,087,844	5,313,510,980	آرماتوربندی ستون طبقه اول		633	640
20	259	8	18.07	42,961,318,291	5,370,164,786	آرماتوربندی ستون طبقه اول		641	648
12	364	8	18.07	43,211,817,750	5,401,477,219	آرماتوربندی ستون طبقه اول		649	656
12	363	8	18.07	43,514,791,487	5,439,348,936	آرماتوربندی ستون طبقه اول		657	664
20	260	8	18.07	44,191,749,067	5,523,968,633	آرماتوربندی ستون طبقه اول		665	672
4	483	8	17.31	37,346,694,761	4,668,336,845	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		673	680
4	482	8	17.31	37,917,424,384	4,739,678,048	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		681	688
4	480	8	17.31	39,581,461,792	4,947,682,724	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		689	696
4	481	8	17.31	39,621,408,269	4,952,676,034	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		697	704
20	248	8	17.31	41,030,791,320	5,128,848,915	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		705	712
11	401	8	15.34	31,605,833,557	3,950,729,195	تکمیل قالب بندی و اجرای داکت سقف طبقه همکف		713	720
4	479	8	11.71	28,530,758,860	3,566,344,858	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		721	728
4	478	8	11.71	29,469,269,038	3,683,658,630	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		729	736
11	399	8	11.71	19,114,414,830	2,389,301,854	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		737	744
11	398	8	11.71	19,146,826,804	2,393,353,351	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		745	752
20	256	8	11.71	27,888,264,603	3,486,033,075	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		753	760
20	257	8	11.71	27,911,740,187	3,488,967,523	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		761	768



زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
20	249	8	11.71	27,923,307,747	3,490,413,468	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		769	776
15	149	8	11.71	28,616,538,598	3,577,067,325	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		777	784
15	148	8	11.71	28,620,189,223	3,577,523,653	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		785	792
15	150	8	11.71	28,656,550,848	3,582,068,856	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		793	800
12	416	8	11.71	28,827,809,307	3,603,476,163	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		801	808
11	397	8	11.45	17,905,380,420	2,238,172,552	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		809	816
20	240	8	11.45	28,351,436,733	3,543,929,592	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		817	824
20	241	8	11.45	28,351,436,733	3,543,929,592	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		825	832
15	145	8	11.45	28,430,361,579	3,553,795,197	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		833	840
15	146	8	11.45	28,605,598,323	3,575,699,790	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		841	848
15	147	8	11.45	29,119,085,897	3,639,885,737	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		849	856
20	255	8	11.21	27,550,630,546	3,443,828,818	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		857	864
12	417	8	11.21	27,594,665,973	3,449,333,247	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		865	872
12	418	8	11.21	27,996,808,456	3,499,601,057	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		873	880
11	406	8	11.07	24,944,368,431	3,118,046,054	فونداسیون تکمیل		881	888
11	407	8	11.07	26,820,962,340	3,352,620,293	فونداسیون تکمیل		889	896
11	408	8	11.07	26,820,962,340	3,352,620,293	فونداسیون تکمیل		897	904
11	409	8	11.07	26,820,962,340	3,352,620,293	فونداسیون تکمیل		905	912
15	165	8	11.07	26,873,839,905	3,359,229,988	فونداسیون تکمیل		913	920
15	166	8	11.07	27,268,483,479	3,408,560,435	فونداسیون تکمیل		921	928
11	410	8	11.07	27,371,326,420	3,421,415,803	فونداسیون تکمیل		929	936
11	411	8	11.07	27,371,326,420	3,421,415,803	فونداسیون تکمیل		937	944
12	354	8	11.07	27,426,550,679	3,428,318,835	فونداسیون تکمیل		945	952
15	161	8	11.07	27,444,880,931	3,430,610,116	فونداسیون تکمیل		953	960

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
20	239	8	11.07	27,625,917,139	3,453,239,642	فونداسیون تکمیل		961	968
15	167	8	11.07	27,743,743,025	3,467,967,878	فونداسیون تکمیل		969	976
15	163	8	11.07	27,841,189,215	3,480,148,652	فونداسیون تکمیل		977	984
15	162	8	11.07	27,843,879,621	3,480,484,953	فونداسیون تکمیل		985	992
20	238	8	11.07	28,142,865,534	3,517,858,192	فونداسیون تکمیل		993	1000
15	164	8	11.07	28,791,262,856	3,598,907,857	فونداسیون تکمیل		1001	1008
15	168	8	11.07	28,912,832,302	3,614,104,038	فونداسیون تکمیل		1009	1016
15	169	8	11.07	29,051,522,442	3,631,440,305	فونداسیون تکمیل		1017	1024
12	355	8	10.56	25,079,685,782	3,134,960,723	فونداسیون تکمیل		1025	1032
12	356	8	10.56	25,079,685,782	3,134,960,723	فونداسیون تکمیل		1033	1040
20	254	8	10.56	26,135,276,303	3,266,909,538	فونداسیون تکمیل		1041	1048
20	250	8	10.56	27,241,674,586	3,405,209,323	فونداسیون تکمیل		1049	1056
20	253	8	10.56	27,620,649,232	3,452,581,154	فونداسیون تکمیل		1057	1064
20	251	8	10.56	27,637,810,662	3,454,726,333	فونداسیون تکمیل		1065	1072
15	170	8	10.56	27,934,891,194	3,491,861,399	فونداسیون تکمیل		1073	1080
15	171	8	10.56	28,141,935,150	3,517,741,894	فونداسیون تکمیل		1081	1088
15	172	8	10.56	29,496,405,889	3,687,050,736	فونداسیون تکمیل		1089	1096
15	173	8	10.56	29,496,405,889	3,687,050,736	فونداسیون تکمیل		1097	1104
20	278	8	10.56	27,447,875,527	3,430,984,441	فونداسیون تکمیل		1105	1112
20	252	8	8.16	20,751,442,307	2,593,930,288	قالب بندی پی		1113	1120
20	277	8	8.16	20,878,256,529	2,609,782,066	قالب بندی پی		1121	1128
20	276	8	8.16	20,985,427,074	2,623,178,384	قالب بندی پی		1129	1136
15	174	8	8.16	22,738,604,273	2,842,325,534	قالب بندی پی		1137	1144
15	151	8	8.16	23,338,915,774	2,917,364,472	قالب بندی پی		1145	1152

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
0	517	8	7.47	12,292,637,825	1,536,579,728	آرماتوربندی پی و ریشه		1153	1160
20	275	8	7.34	18,712,817,728	2,339,102,216	آرماتوربندی پی و ریشه		1161	1168
20	272	8	7.34	18,800,736,914	2,350,092,114	آرماتوربندی پی و ریشه		1169	1176
20	273	8	7.34	18,835,244,241	2,354,405,530	آرماتوربندی پی و ریشه		1177	1184
20	274	8	7.34	18,835,244,241	2,354,405,530	آرماتوربندی پی و ریشه		1185	1192
11	412	8	7.34	20,336,249,846	2,542,031,231	آرماتوربندی پی و ریشه		1193	1200
12	360	8	7.34	20,337,735,356	2,542,216,919	آرماتوربندی پی و ریشه		1201	1208
20	269	8	7.34	20,369,801,070	2,546,225,134	آرماتوربندی پی و ریشه		1209	1216
20	270	8	7.34	20,538,886,968	2,567,360,871	آرماتوربندی پی و ریشه		1217	1224
12	359	8	6.40	18,105,674,407	2,263,209,301	آرماتوربندی پی و ریشه		1225	1232
20	300	8	6.40	18,105,674,407	2,263,209,301	آرماتوربندی پی و ریشه		1233	1240
20	299	8	6.40	18,149,742,754	2,268,717,844	آرماتوربندی پی و ریشه		1241	1248
12	358	8	3.81	11,943,196,219	1,492,899,527	آرماتوربندی پی و ریشه		1249	1256
0	708	8	1.72	7,734,819,200	966,852,400	اجرای بتن مگر		1257	1264
15	141	8	1.21	5,776,311,195	722,038,899	اجرای بتن مگر		1265	1272
15	144	8	1.21	5,776,311,195	722,038,899	اجرای بتن مگر		1273	1280
15	153	8	1.21	5,776,311,195	722,038,899	اجرای بتن مگر		1281	1288
15	175	8	1.21	5,776,311,195	722,038,899	اجرای بتن مگر		1289	1296
15	176	8	1.21	5,776,311,195	722,038,899	اجرای بتن مگر		1297	1304
17	135	8	1.21	5,776,311,195	722,038,899	اجرای بتن مگر		1305	1312
17	138	8	1.21	5,776,311,195	722,038,899	اجرای بتن مگر		1313	1320
17	139	8	1.21	5,776,311,195	722,038,899	اجرای بتن مگر		1321	1328
17	140	8	1.21	5,776,311,195	722,038,899	اجرای بتن مگر		1329	1336
20	271	8	1.21	5,948,847,826	743,605,978	اجرای بتن مگر		1337	1344

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
0	567	8	1.21	5,948,847,826	743,605,978	اجرای بتن مگر		1345	1352
0	568	8	1.21	5,948,847,826	743,605,978	اجرای بتن مگر		1353	1360
0	569	8	1.21	5,948,847,826	743,605,978	اجرای بتن مگر		1361	1368
15	177	8	1.21	5,951,555,470	743,944,434	اجرای بتن مگر		1369	1376
15	181	8	1.21	5,951,555,470	743,944,434	اجرای بتن مگر		1377	1384
15	182	8	1.21	5,951,555,470	743,944,434	اجرای بتن مگر		1385	1392
0	563	8	1.21	5,982,209,167	747,776,146	اجرای بتن مگر		1393	1400
0	564	8	1.21	5,982,209,167	747,776,146	اجرای بتن مگر		1401	1408
0	565	8	1.21	5,982,209,167	747,776,146	اجرای بتن مگر		1409	1416
0	566	8	1.21	5,982,209,167	747,776,146	اجرای بتن مگر		1417	1424
15	178	8	1.21	5,986,604,325	748,325,541	اجرای بتن مگر		1425	1432
15	179	8	1.21	5,986,604,325	748,325,541	اجرای بتن مگر		1433	1440
15	180	8	1.21	5,986,604,325	748,325,541	اجرای بتن مگر		1441	1448
15	184	8	1.21	5,994,653,544	749,331,693	اجرای بتن مگر		1449	1456
15	185	8	1.21	5,994,653,544	749,331,693	اجرای بتن مگر		1457	1464
15	183	8	1.21	6,038,322,014	754,790,252	اجرای بتن مگر		1465	1472
12	357	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1473	1480
12	413	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1481	1488
15	142	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1489	1496
15	143	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1497	1504
15	152	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1505	1512
17	133	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1513	1520
17	134	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1521	1528
17	137	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1529	1536



زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
20	279	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1537	1544
20	280	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1545	1552
20	281	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1553	1560
20	282	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1561	1568
20	283	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1569	1576
20	284	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1577	1584
20	285	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1585	1592
20	286	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1593	1600
20	287	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1601	1608
20	288	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1609	1616
20	289	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1617	1624
20	290	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1625	1632
20	291	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1633	1640
20	292	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1641	1648
20	293	8	1.21	5,773,468,056	721,683,507	اجرای بتن مگر		1649	1656
20	294	8	1.18	5,745,036,659	718,129,582	اجرای بتن مگر		1657	1664
20	295	8	1.18	5,745,036,659	718,129,582	اجرای بتن مگر		1665	1672
20	296	8	1.18	5,745,036,659	718,129,582	اجرای بتن مگر		1673	1680
20	297	8	1.18	5,745,036,659	718,129,582	اجرای بتن مگر		1681	1688
20	298	8	1.18	5,745,036,659	718,129,582	اجرای بتن مگر		1689	1696
12	361	8	1.06	5,634,154,211	704,269,276	تسطیح ورگلاژ دستی پی		1697	1704
12	362	8	1.06	5,634,154,211	704,269,276	تسطیح ورگلاژ دستی پی		1705	1712
12	419	8	1.06	5,634,154,211	704,269,276	تسطیح ورگلاژ دستی پی		1713	1720
12	420	8	1.06	5,634,154,211	704,269,276	تسطیح ورگلاژ دستی پی		1721	1728

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
17	132	8	1.06	5,634,154,211	704,269,276	تسطیح ورگلاژ دستی پی		1729	1736
17	136	8	1.06	5,634,154,211	704,269,276	تسطیح ورگلاژ دستی پی		1737	1744
0	446	8	1.06	5,634,154,211	704,269,276	تسطیح ورگلاژ دستی پی		1745	1752
0	447	8	1.06	5,634,154,211	704,269,276	تسطیح ورگلاژ دستی پی		1753	1760
0	448	8	1.06	5,634,154,211	704,269,276	تسطیح ورگلاژ دستی پی		1761	1768
18	186	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1769	1776
18	187	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1777	1784
18	188	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1785	1792
18	189	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1793	1800
18	190	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1801	1808
18	191	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1809	1816
18	192	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1817	1824
18	193	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1825	1832
18	194	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1833	1840
18	195	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1841	1848
18	196	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1849	1856
18	197	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1857	1864
18	198	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1865	1872
18	199	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1873	1880
18	200	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1881	1888
18	201	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1889	1896
18	202	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1897	1904
18	203	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1905	1912
18	204	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1913	1920

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
18	205	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1921	1928
18	206	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1929	1936
18	207	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1937	1944
18	208	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1945	1952
18	209	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1953	1960
18	210	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1961	1968
18	211	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1969	1976
18	212	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1977	1984
18	213	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1985	1992
18	214	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1993	2000
18	215	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2001	2008
18	216	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2009	2016
18	217	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2017	2024
18	218	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2025	2032
18	219	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2033	2040
19	220	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2041	2048
19	221	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2049	2056
19	222	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2057	2064
19	223	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2065	2072
19	224	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2073	2080
19	225	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2081	2088
19	226	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2089	2096
19	227	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2097	2104
19	228	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2105	2112

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
19	229	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2113	2120
19	230	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2121	2128
19	231	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2129	2136
19	232	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2137	2144
19	233	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2145	2152
19	234	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2153	2160
19	235	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2161	2168
19	236	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2169	2176
19	237	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		2177	2184



۰۲۱۹۱۶۹۲۵۲۴




hosseinfirouzi.ir



mhossein.firouzi



mhosseinfirouzi



MOHAMMAD HOSSEIN
FIROUZI
