


اجرای طرح شمع

پروژه ۸۴ و ۲۱ واحدی مسکن ملی داراب

هر متقاضی بر اساس رتبه خود، نام و موقعیت بلوک متعلق به خود را
تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵ (با شاخص‌های موقت) مشاهده فرماید.



MOHAMMAD HOSSEIN
FIROUZI



گزارش هزینه کرد هر بلوک تا پایان مرداد ۱۴۰۵

توجه : مبالغ تمام شده با توجه به شاخص های قطعی تعدیل تغییر می کنند!

زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تار تبه
11	390	8	54.05	115,859,416,500	14,482,427,062	اسکلت تکمیل شده	دیوارچینی کامل	1	8
11	388	8	50.39	94,812,673,390	11,851,584,174	اسکلت تکمیل شده	والپست طبقه سوم دیوارچینی طبقه همکف	9	16
11	391	8	50.39	108,581,232,837	13,572,654,105	اسکلت تکمیل شده	والپست طبقه سوم دیوارچینی طبقه همکف	17	24
11	392	8	46.23	87,651,139,067	10,956,392,383	اسکلت تکمیل شده	دیوارچینی طبقه همکف والپست اول	25	32
11	389	8	45.9	88,098,691,005	11,012,336,376	کیورینگ ستون خرپشته	دیوارچینی طبقه همکف	33	40
11	393	8	45.9	89,646,958,817	11,205,869,852	کیورینگ ستون خرپشته	دیوارچینی طبقه همکف	41	48
11	402	8	45.9	94,302,037,184	11,787,754,648	کیورینگ ستون خرپشته	دیوارچینی طبقه همکف	49	56
11	387	8	45.8	98,303,626,081	12,287,953,260	عمل آوری بتن سقف طبقه چهارم	دیوارچینی طبقه همکف	57	64
11	403	8	45.9	101,622,277,411	12,702,784,676	کیورینگ ستون خرپشته	دیوارچینی طبقه همکف	65	72
11	404	8	45.9	104,453,921,257	13,056,740,157	کیورینگ ستون خرپشته	دیوارچینی طبقه همکف	73	80
11	386	8	42.40	89,461,692,146	11,182,711,518	آرماتوربندی تیر سقف طبقه چهارم	دیوارچینی طبقه همکف	81	88
11	405	8	43.97	101,239,752,641	12,654,969,080	تیرچه بلوک سقف طبقه چهارم	دیوارچینی طبقه همکف	89	96
11	385	8	38.58	77,149,567,838	9,643,695,980	عمل آوری بتن سقف طبقه سوم	والپست همکف	97	104
13	327	8	37.20	83,776,764,749	10,472,095,594	عمل آوری بتن سقف طبقه سوم		105	112
20	265	8	37.20	85,569,546,276	10,696,193,285	عمل آوری بتن سقف طبقه سوم		113	120
11	394	8	35.77	69,986,964,124	8,748,370,516	آرماتوربندی تیر سقف طبقه سوم	دیوارچینی طبقه همکف	121	128
11	344	8	32.52	62,828,797,418	7,853,599,677	عمل آوری بتن سقف طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	129	136
13	328	8	31.60	69,313,246,091	8,664,155,761	عمل آوری بتن ستون طبقه سوم		137	144
20	264	8	31.60	72,170,684,038	9,021,335,505	عمل آوری بتن ستون طبقه سوم		145	152
11	395	8	27.19	53,038,159,471	6,629,769,934	آرماتوربندی تیر سقف طبقه دوم		153	160
11	341	8	26.92	47,794,979,804	5,974,372,475	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	161	168
11	348	8	26.66	48,228,244,901	6,028,530,613	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	169	176
11	349	8	26.66	48,332,767,764	6,041,595,970	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	177	184
11	342	8	26.92	48,731,653,683	6,091,456,710	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	185	192
11	343	8	26.92	49,583,645,758	6,197,955,720	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	193	200



زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تارتنه
11	347	8	26.66	49,887,004,520	6,235,875,565	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	201	208
11	345	8	26.92	51,387,806,661	6,423,475,833	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	209	216
11	346	8	26.66	51,530,830,337	6,441,353,792	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	217	224
11	351	8	26.92	51,658,098,697	6,457,262,337	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	225	232
11	352	8	26.35	52,117,035,884	6,514,629,486	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	والپست همکف	233	240
11	384	8	26.92	52,816,766,083	6,602,095,760	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	دیوارچینی طبقه همکف	241	248
11	353	8	26.35	58,217,266,627	7,277,158,328	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم	والپست همکف	249	256
11	369	8	26.09	59,156,332,282	7,394,541,535	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	والپست همکف	257	264
11	374	8	26.09	60,406,347,444	7,550,793,430	آرماتوربندی ستون طبقه دوم	والپست همکف	265	272
11	350	8	25.33	48,635,301,500	6,079,412,688	عمل آوری بتن سقف طبقه اول	والپست همکف	273	280
11	376	8	25.90	55,865,360,196	6,983,170,024	عمل آوری بتن سقف طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	281	288
11	373	8	25.33	58,744,391,657	7,343,048,957	عمل آوری بتن سقف طبقه اول	والپست همکف	289	296
11	370	8	25.33	59,091,444,276	7,386,430,535	عمل آوری بتن سقف طبقه اول	والپست همکف	297	304
0	449	8	24.97	53,364,333,270	6,670,541,659	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		305	312
0	450	8	24.97	53,943,512,215	6,742,939,027	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		313	320
0	451	8	24.97	54,333,137,851	6,791,642,231	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		321	328
20	245	8	24.97	55,229,472,249	6,903,684,031	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		329	336
20	262	8	24.97	56,535,206,666	7,066,900,833	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		337	344
20	244	8	24.70	56,540,300,041	7,067,537,505	آرماتوربندی ستون طبقه دوم		345	352
0	452	8	24.97	56,571,998,771	7,071,499,846	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		353	360
20	247	8	24.70	56,777,938,223	7,097,242,278	آرماتوربندی ستون طبقه دوم		361	368
20	246	8	24.97	56,958,899,037	7,119,862,380	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		369	376
20	243	8	24.70	57,739,520,029	7,217,440,004	آرماتوربندی ستون طبقه دوم		377	384
20	263	8	24.97	58,133,252,553	7,266,656,569	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		385	392
20	261	8	24.97	58,566,395,947	7,320,799,493	عمل آوری بتن ستون طبقه دوم		393	400



زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تارتنه
11	396	8	23.94	45,551,988,931	5,693,998,616	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		401	408
12	422	8	23.94	45,688,045,766	5,711,005,721	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		409	416
12	423	8	23.94	46,747,702,235	5,843,462,779	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		417	424
12	424	8	23.94	48,722,544,051	6,090,318,006	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		425	432
13	331	8	23.94	52,908,812,326	6,613,601,541	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		433	440
0	453	8	23.94	55,049,844,339	6,881,230,542	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		441	448
20	242	8	23.94	56,059,580,906	7,007,447,613	عمل آوری بتن سقف طبقه اول		449	456
11	379	8	20.80	38,876,355,920	4,859,544,490	قالب بندی تیرها سقف طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	457	464
11	383	8	20.30	41,563,049,317	5,195,381,165	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	465	472
11	381	8	20.30	35,763,324,000	4,470,415,500	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	473	480
11	382	8	20.30	36,875,916,783	4,609,489,598	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	481	488
11	378	8	20.30	39,731,013,264	4,966,376,658	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	489	496
11	377	8	20.30	44,608,980,515	5,576,122,564	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	دیوارچینی طبقه همکف	497	504
11	380	8	19.73	40,146,282,728	5,018,285,341	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	505	512
12	414	8	19.73	32,239,353,122	4,029,919,140	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	513	520
12	368	8	19.73	42,418,016,195	5,302,252,024	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	521	528
11	372	8	19.73	45,289,584,199	5,661,198,025	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	529	536
11	371	8	19.73	45,833,447,677	5,729,180,960	عمل آوری بتن ستون طبقه اول	والپست همکف	537	544
11	375	8	19.27	43,061,163,779	5,382,645,472	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف	دیوارچینی طبقه همکف	545	552
12	415	8	18.34	31,537,354,238	3,942,169,280	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		553	560
12	366	8	18.34	36,991,615,891	4,623,951,986	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		561	568
12	367	8	18.34	37,011,142,514	4,626,392,814	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		569	576
12	365	8	18.34	40,125,319,244	5,015,664,906	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		577	584
20	266	8	18.34	43,235,158,772	5,404,394,846	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		585	592
20	267	8	18.34	43,297,638,319	5,412,204,790	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		593	600



زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تارتنه
20	258	8	18.34	43,503,602,433	5,437,950,304	عمل آوری بتن ستون طبقه اول		601	608
12	421	8	18.07	30,544,283,795	3,818,035,474	آرماتوربندی ستون طبقه اول		609	616
13	329	8	18.07	39,548,595,261	4,943,574,408	آرماتوربندی ستون طبقه اول		617	624
13	330	8	18.07	41,643,635,467	5,205,454,433	آرماتوربندی ستون طبقه اول		625	632
11	400	8	18.07	42,508,087,844	5,313,510,980	آرماتوربندی ستون طبقه اول		633	640
20	259	8	18.07	42,961,318,291	5,370,164,786	آرماتوربندی ستون طبقه اول		641	648
12	364	8	18.07	43,211,817,750	5,401,477,219	آرماتوربندی ستون طبقه اول		649	656
12	363	8	18.07	43,514,791,487	5,439,348,936	آرماتوربندی ستون طبقه اول		657	664
20	260	8	18.07	44,191,749,067	5,523,968,633	آرماتوربندی ستون طبقه اول		665	672
4	483	8	17.31	37,346,694,761	4,668,336,845	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		673	680
4	482	8	17.31	37,917,424,384	4,739,678,048	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		681	688
4	480	8	17.31	39,581,461,792	4,947,682,724	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		689	696
4	481	8	17.31	39,621,408,269	4,952,676,034	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		697	704
20	248	8	17.31	41,030,791,320	5,128,848,915	عمل آوری بتن سقف طبقه همکف		705	712
11	401	8	15.34	31,605,833,557	3,950,729,195	تکمیل قالب بندی و اجرای داکت سقف طبقه همکف		713	720
4	479	8	11.71	28,530,758,860	3,566,344,858	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		721	728
4	478	8	11.71	29,469,269,038	3,683,658,630	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		729	736
11	399	8	11.71	19,114,414,830	2,389,301,854	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		737	744
11	398	8	11.71	19,146,826,804	2,393,353,351	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		745	752
20	256	8	11.71	27,888,264,603	3,486,033,075	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		753	760
20	257	8	11.71	27,911,740,187	3,488,967,523	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		761	768
20	249	8	11.71	27,923,307,747	3,490,413,468	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		769	776
15	149	8	11.71	28,616,538,598	3,577,067,325	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		777	784
15	148	8	11.71	28,620,189,223	3,577,523,653	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		785	792
15	150	8	11.71	28,656,550,848	3,582,068,856	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		793	800



زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	از رتبه	تا رتبه
12	416	8	11.71	28,827,809,307	3,603,476,163	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		801	808
11	397	8	11.45	17,905,380,420	2,238,172,552	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		809	816
20	240	8	11.45	28,351,436,733	3,543,929,592	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		817	824
20	241	8	11.45	28,351,436,733	3,543,929,592	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		825	832
15	145	8	11.45	28,430,361,579	3,553,795,197	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		833	840
15	146	8	11.45	28,605,598,323	3,575,699,790	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		841	848
15	147	8	11.45	29,119,085,897	3,639,885,737	آرماتوربندی ستون طبقه همکف		849	856
20	255	8	11.21	27,550,630,546	3,443,828,818	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		857	864
12	417	8	11.21	27,594,665,973	3,449,333,247	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		865	872
12	418	8	11.21	27,996,808,456	3,499,601,057	عمل آوری بتن ستون طبقه همکف		873	880
11	406	8	11	24,944,368,431	3,118,046,054	فونداسیون تکمیل		881	888
20	254	8	11	26,135,276,303	3,266,909,538	فونداسیون تکمیل		889	896
12	355	8	11	26,430,245,934	3,303,780,742	فونداسیون تکمیل		897	904
12	356	8	11	26,430,245,934	3,303,780,742	فونداسیون تکمیل		905	912
11	407	8	11	26,820,962,340	3,352,620,293	فونداسیون تکمیل		913	920
11	408	8	11	26,820,962,340	3,352,620,293	فونداسیون تکمیل		921	928
11	409	8	11	26,820,962,340	3,352,620,293	فونداسیون تکمیل		929	936
15	165	8	11	26,873,839,905	3,359,229,988	فونداسیون تکمیل		937	944
20	252	8	11	27,126,086,224	3,390,760,778	فونداسیون تکمیل		945	952
20	250	8	11	27,241,674,586	3,405,209,323	فونداسیون تکمیل		953	960
20	277	8	11	27,252,900,446	3,406,612,556	فونداسیون تکمیل		961	968
15	166	8	11	27,268,483,479	3,408,560,435	فونداسیون تکمیل		969	976
20	276	8	11	27,360,070,990	3,420,008,874	فونداسیون تکمیل		977	984
11	410	8	11	27,371,326,420	3,421,415,803	فونداسیون تکمیل		985	992
11	411	8	11	27,371,326,420	3,421,415,803	فونداسیون تکمیل		993	1000



تارته	از رته	سفت کاری	آخرین مرحله اجرایی	قیمت هر واحد این بلوک	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	درصد پیشرفت	تعداد واحد	بلوک	زون
1008	1001		فونداسیون تکمیل	3,428,318,835	27,426,550,679	11	8	354	12
1016	1009		فونداسیون تکمیل	3,430,610,116	27,444,880,931	11	8	161	15
1024	1017		فونداسیون تکمیل	3,430,984,441	27,447,875,527	11	8	278	20
1032	1025		فونداسیون تکمیل	3,440,689,382	27,525,515,053	11	8	275	20
1040	1033		فونداسیون تکمیل	3,452,581,154	27,620,649,232	11	8	253	20
1048	1041		فونداسیون تکمیل	3,453,239,642	27,625,917,139	11	8	239	20
1056	1049		فونداسیون تکمیل	3,454,726,333	27,637,810,662	11	8	251	20
1064	1057		فونداسیون تکمیل	3,455,992,696	27,647,941,566	11	8	273	20
1072	1065		فونداسیون تکمیل	3,455,992,696	27,647,941,566	11	8	274	20
1080	1073		فونداسیون تکمیل	3,467,967,878	27,743,743,025	11	8	167	15
1088	1081		فونداسیون تکمیل	3,480,148,652	27,841,189,215	11	8	163	15
1096	1089		فونداسیون تکمیل	3,480,484,953	27,843,879,621	11	8	162	15
1104	1097		فونداسیون تکمیل	3,517,858,192	28,142,865,534	11	8	238	20
1112	1105		فونداسیون تکمیل	3,598,907,857	28,791,262,856	11	8	164	15
1120	1113		فونداسیون تکمیل	3,609,159,439	28,873,275,516	11	8	360	12
1128	1121		فونداسیون تکمیل	3,614,104,038	28,912,832,302	11	8	168	15
1136	1129		فونداسیون تکمیل	3,631,440,305	29,051,522,442	11	8	169	15
1144	1137		فونداسیون تکمیل	3,655,362,344	29,242,898,752	11	8	412	11
1152	1145		فونداسیون تکمیل	3,660,681,418	29,285,451,346	11	8	170	15
1160	1153		فونداسیون تکمیل	3,686,561,913	29,492,495,302	11	8	171	15
1168	1161		فونداسیون تکمیل	3,855,870,755	30,846,966,041	11	8	172	15
1176	1169		فونداسیون تکمیل	3,863,210,722	30,905,685,779	11	8	173	15
1184	1177		فونداسیون تکمیل	3,815,316,010	30,522,528,080	11	8	174	15
1192	1185		فونداسیون تکمیل	3,890,354,948	31,122,839,581	11	8	151	15
1200	1193		قالب بندی پی	2,631,948,092	21,055,584,739	8.16	8	272	20



تارته	از رته	سفت کاری	آخرین مرحله اجرایی	قیمت هر واحد این بلوک	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	درصد پیشرفت	تعداد واحد	بلوک	زون
1208	1201		قالب بندی پی	2,828,081,112	22,624,648,894	8.16	8	269	20
1216	1209		قالب بندی پی	2,849,216,849	22,793,734,792	8.16	8	270	20
1224	1217		قالب بندی پی	2,844,963,086	22,759,704,690	8.16	8	359	12
1232	1225		آرماتوربندی پی و ریشه	1,536,579,728	12,292,637,825	7.47	8	517	0
1240	1233		آرماتوربندی پی	2,263,209,301	18,105,674,407	6.40	8	300	20
1248	1241		آرماتوربندی پی	2,268,717,844	18,149,742,754	6.40	8	299	20
1256	1249		آرماتوربندی پی	2,391,315,457	19,130,523,659	6.40	8	358	12
1264	1257		اجرای بتن مگر	966,852,400	7,734,819,200	1.72	8	708	0
1272	1265		اجرای بتن مگر	722,038,899	5,776,311,195	1.21	8	141	15
1280	1273		اجرای بتن مگر	722,038,899	5,776,311,195	1.21	8	144	15
1288	1281		اجرای بتن مگر	722,038,899	5,776,311,195	1.21	8	153	15
1296	1289		اجرای بتن مگر	722,038,899	5,776,311,195	1.21	8	175	15
1304	1297		اجرای بتن مگر	722,038,899	5,776,311,195	1.21	8	176	15
1312	1305		اجرای بتن مگر	722,038,899	5,776,311,195	1.21	8	135	17
1320	1313		اجرای بتن مگر	722,038,899	5,776,311,195	1.21	8	138	17
1328	1321		اجرای بتن مگر	722,038,899	5,776,311,195	1.21	8	139	17
1336	1329		اجرای بتن مگر	722,038,899	5,776,311,195	1.21	8	140	17
1344	1337		اجرای بتن مگر	743,605,978	5,948,847,826	1.21	8	271	20
1352	1345		اجرای بتن مگر	743,605,978	5,948,847,826	1.21	8	567	0
1360	1353		اجرای بتن مگر	743,605,978	5,948,847,826	1.21	8	568	0
1368	1361		اجرای بتن مگر	743,605,978	5,948,847,826	1.21	8	569	0
1376	1369		اجرای بتن مگر	743,944,434	5,951,555,470	1.21	8	177	15
1384	1377		اجرای بتن مگر	743,944,434	5,951,555,470	1.21	8	181	15
1392	1385		اجرای بتن مگر	743,944,434	5,951,555,470	1.21	8	182	15
1400	1393		اجرای بتن مگر	747,776,146	5,982,209,167	1.21	8	563	0



تارته	از رته	سفت کاری	آخرین مرحله اجرایی	قیمت هر واحد این بلوک	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	درصد پیشرفت	تعداد واحد	بلوک	زون
1408	1401		اجرای بتن مگر	747,776,146	5,982,209,167	1.21	8	564	0
1416	1409		اجرای بتن مگر	747,776,146	5,982,209,167	1.21	8	565	0
1424	1417		اجرای بتن مگر	747,776,146	5,982,209,167	1.21	8	566	0
1432	1425		اجرای بتن مگر	748,325,541	5,986,604,325	1.21	8	178	15
1440	1433		اجرای بتن مگر	748,325,541	5,986,604,325	1.21	8	179	15
1448	1441		اجرای بتن مگر	748,325,541	5,986,604,325	1.21	8	180	15
1456	1449		اجرای بتن مگر	749,331,693	5,994,653,544	1.21	8	184	15
1464	1457		اجرای بتن مگر	749,331,693	5,994,653,544	1.21	8	185	15
1472	1465		اجرای بتن مگر	754,790,252	6,038,322,014	1.21	8	183	15
1480	1473		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	357	12
1488	1481		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	413	12
1496	1489		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	142	15
1504	1497		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	143	15
1512	1505		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	152	15
1520	1513		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	133	17
1528	1521		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	134	17
1536	1529		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	137	17
1544	1537		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	279	20
1552	1545		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	280	20
1560	1553		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	281	20
1568	1561		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	282	20
1576	1569		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	283	20
1584	1577		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	284	20
1592	1585		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	285	20
1600	1593		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	286	20



تارته	ازرتبه	سفت کاری	آخرین مرحله اجرایی	قیمت هر واحد این بلوک	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	درصد پیشرفت	تعداد واحد	بلوک	زون
1608	1601		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	287	20
1616	1609		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	288	20
1624	1617		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	289	20
1632	1625		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	290	20
1640	1633		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	291	20
1648	1641		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	292	20
1656	1649		اجرای بتن مگر	721,683,507	5,773,468,056	1.21	8	293	20
1664	1657		اجرای بتن مگر	718,129,582	5,745,036,659	1.18	8	294	20
1672	1665		اجرای بتن مگر	718,129,582	5,745,036,659	1.18	8	295	20
1680	1673		اجرای بتن مگر	718,129,582	5,745,036,659	1.18	8	296	20
1688	1681		اجرای بتن مگر	718,129,582	5,745,036,659	1.18	8	297	20
1696	1689		اجرای بتن مگر	718,129,582	5,745,036,659	1.18	8	298	20
1704	1697		تسطیح ورگلاژ دستی پی	704,269,276	5,634,154,211	1.06	8	361	12
1712	1705		تسطیح ورگلاژ دستی پی	704,269,276	5,634,154,211	1.06	8	362	12
1720	1713		تسطیح ورگلاژ دستی پی	704,269,276	5,634,154,211	1.06	8	419	12
1728	1721		تسطیح ورگلاژ دستی پی	704,269,276	5,634,154,211	1.06	8	420	12
1736	1729		تسطیح ورگلاژ دستی پی	704,269,276	5,634,154,211	1.06	8	132	17
1744	1737		تسطیح ورگلاژ دستی پی	704,269,276	5,634,154,211	1.06	8	136	17
1752	1745		تسطیح ورگلاژ دستی پی	704,269,276	5,634,154,211	1.06	8	446	0
1760	1753		تسطیح ورگلاژ دستی پی	704,269,276	5,634,154,211	1.06	8	447	0
1768	1761		تسطیح ورگلاژ دستی پی	704,269,276	5,634,154,211	1.06	8	448	0
1776	1769		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	186	18
1784	1777		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	187	18
1792	1785		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	188	18
1800	1793		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	189	18




زون	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	سفت کاری	ازرتبه	تارته
18	190	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1801	1808
18	191	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1809	1816
18	192	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1817	1824
18	193	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1825	1832
18	194	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1833	1840
18	195	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1841	1848
18	196	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1849	1856
18	197	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1857	1864
18	198	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1865	1872
18	199	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1873	1880
18	200	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1881	1888
18	201	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1889	1896
18	202	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1897	1904
18	203	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1905	1912
18	204	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1913	1920
18	205	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1921	1928
18	206	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1929	1936
18	207	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1937	1944
18	208	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1945	1952
18	209	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1953	1960
18	210	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1961	1968
18	211	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1969	1976
18	212	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1977	1984
18	213	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1985	1992
18	214	8	0.00	4,648,532,458	581,066,557	اجرا شروع نشده		1993	2000



تاریخ	از رتبه	سفت کاری	آخرین مرحله اجرایی	قیمت هر واحد این بلوک	مبلغ تمام شده بلوک تا آخر مرداد	درصد پیشرفت	تعداد واحد	بلوک	زون
2008	2001		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	215	18
2016	2009		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	216	18
2024	2017		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	217	18
2032	2025		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	218	18
2040	2033		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	219	18
2048	2041		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	220	19
2056	2049		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	221	19
2064	2057		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	222	19
2072	2065		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	223	19
2080	2073		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	224	19
2088	2081		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	225	19
2096	2089		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	226	19
2104	2097		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	227	19
2112	2105		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	228	19
2120	2113		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	229	19
2128	2121		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	230	19
2136	2129		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	231	19
2144	2137		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	232	19
2152	2145		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	233	19
2160	2153		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	234	19
2168	2161		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	235	19
2176	2169		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	236	19
2184	2177		اجرا شروع نشده	581,066,557	4,648,532,458	0.00	8	237	19


نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۱۳۸۴ واحدی

ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

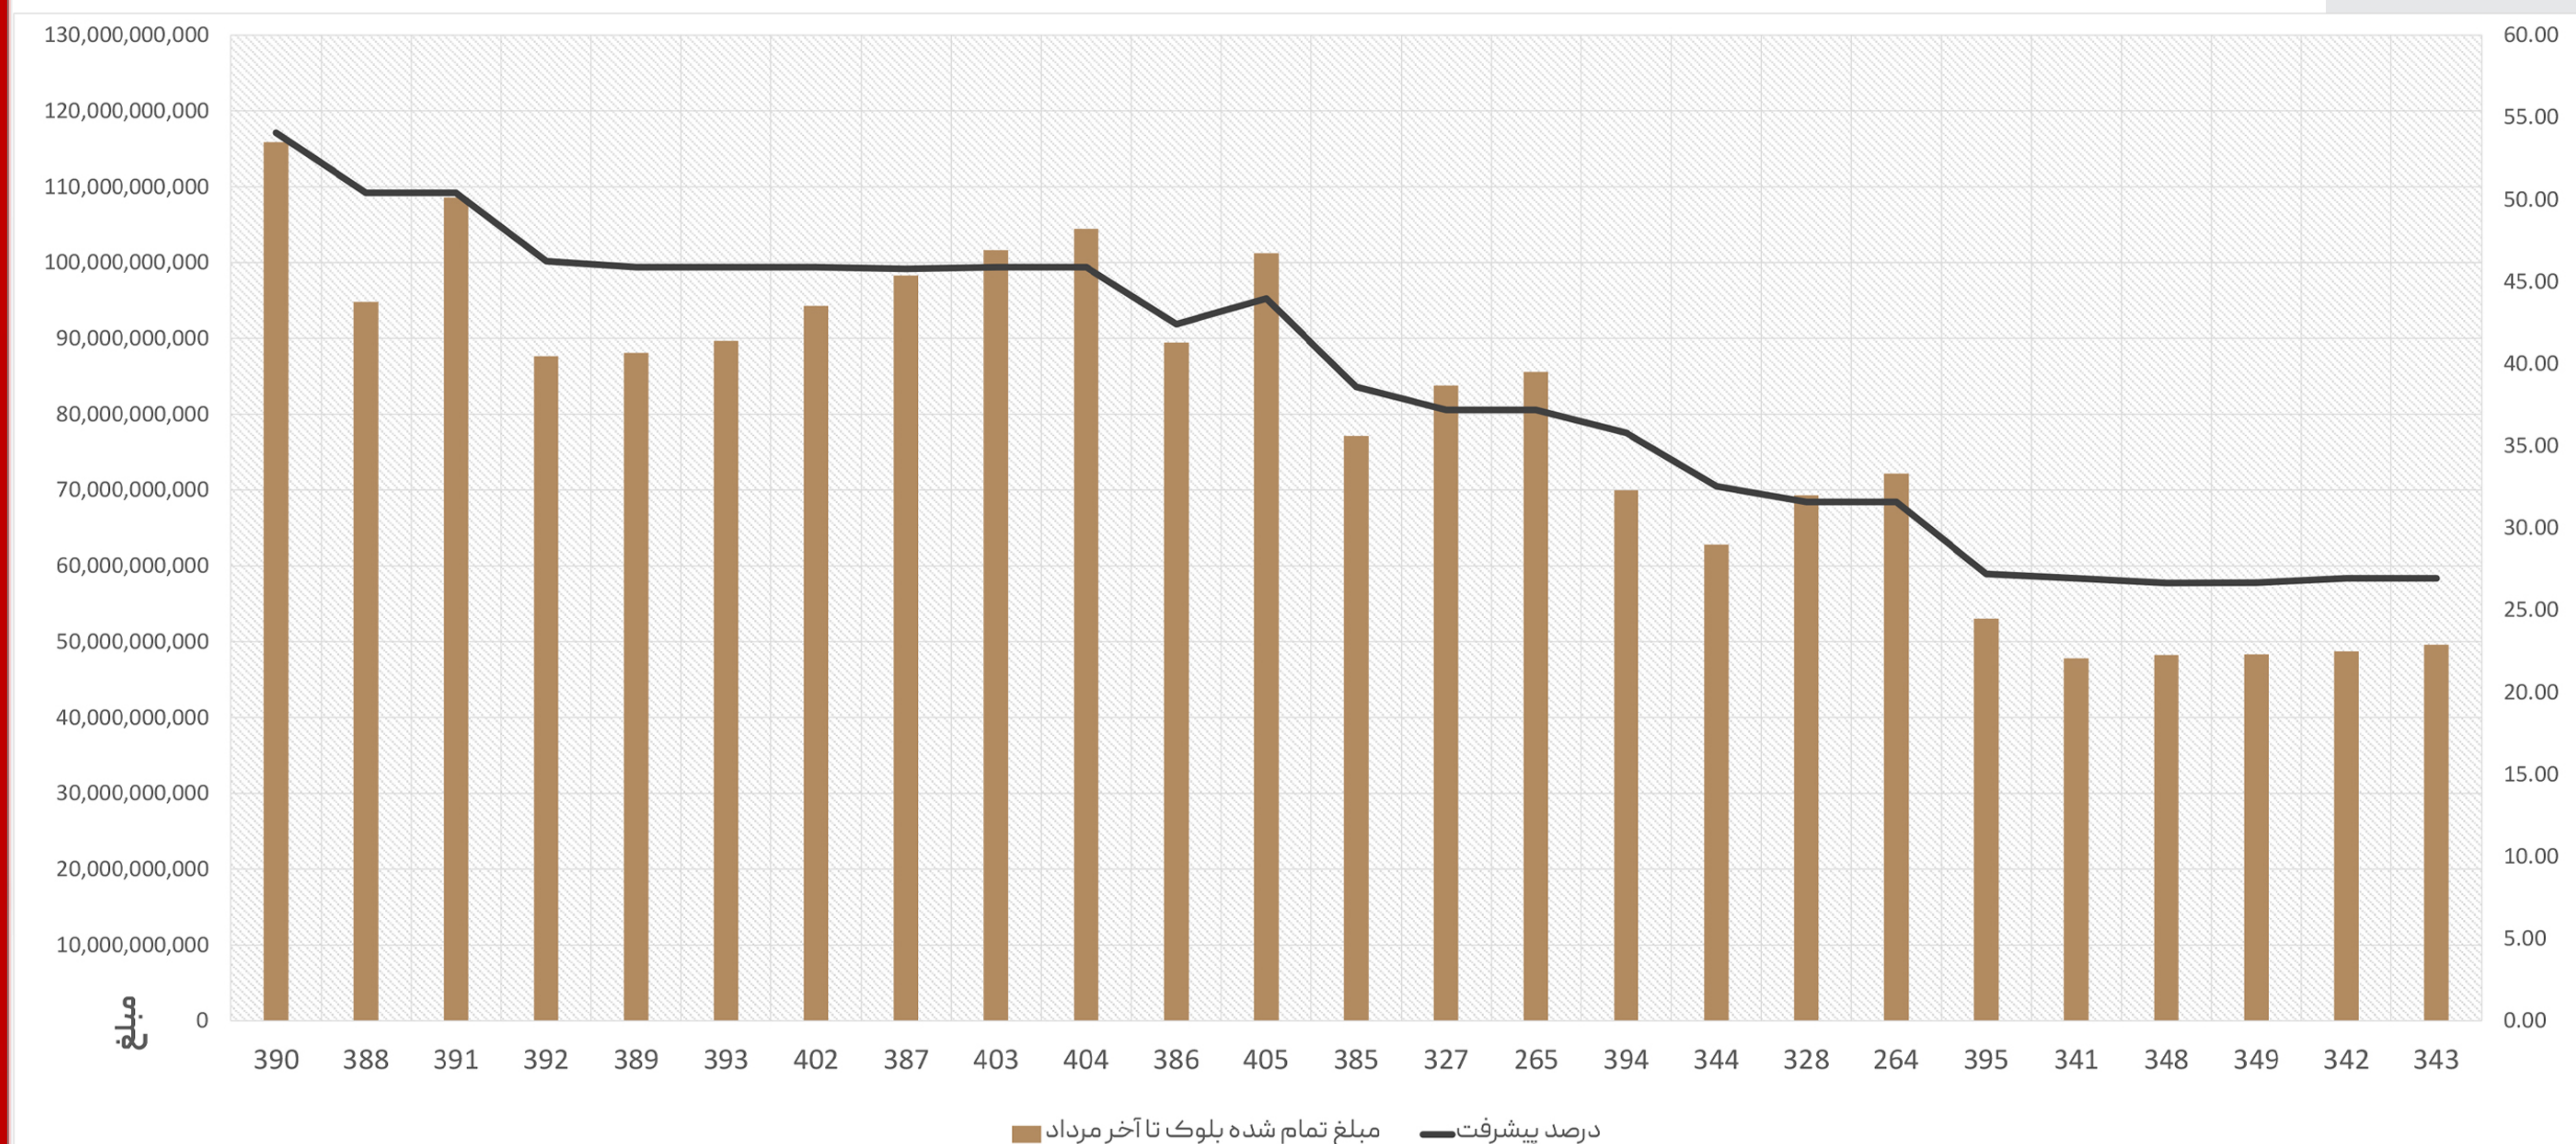




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

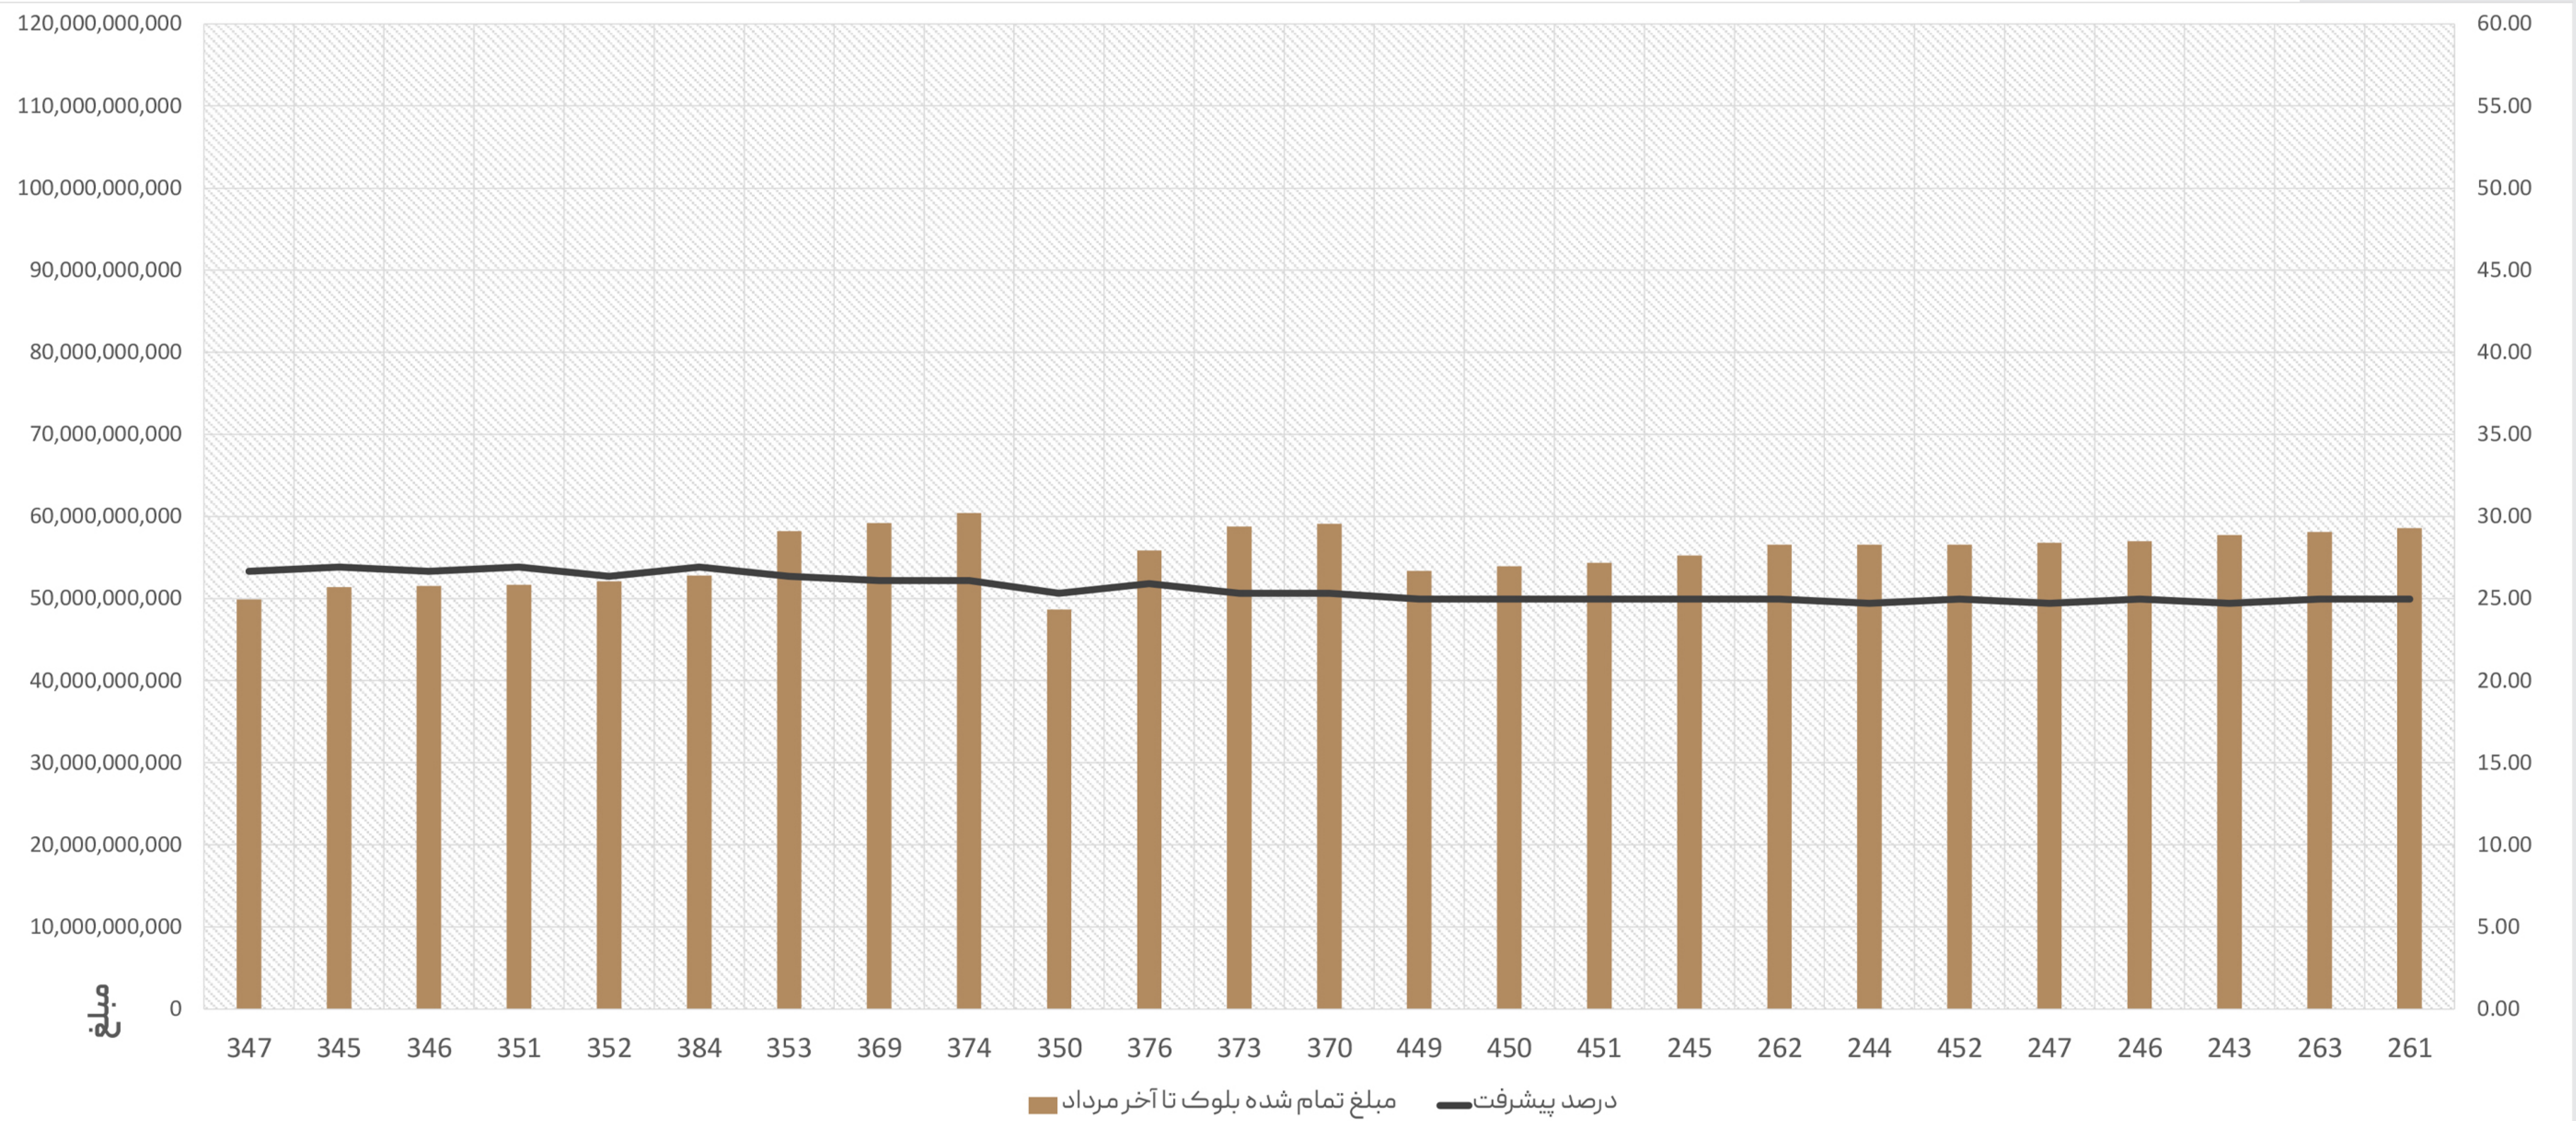




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

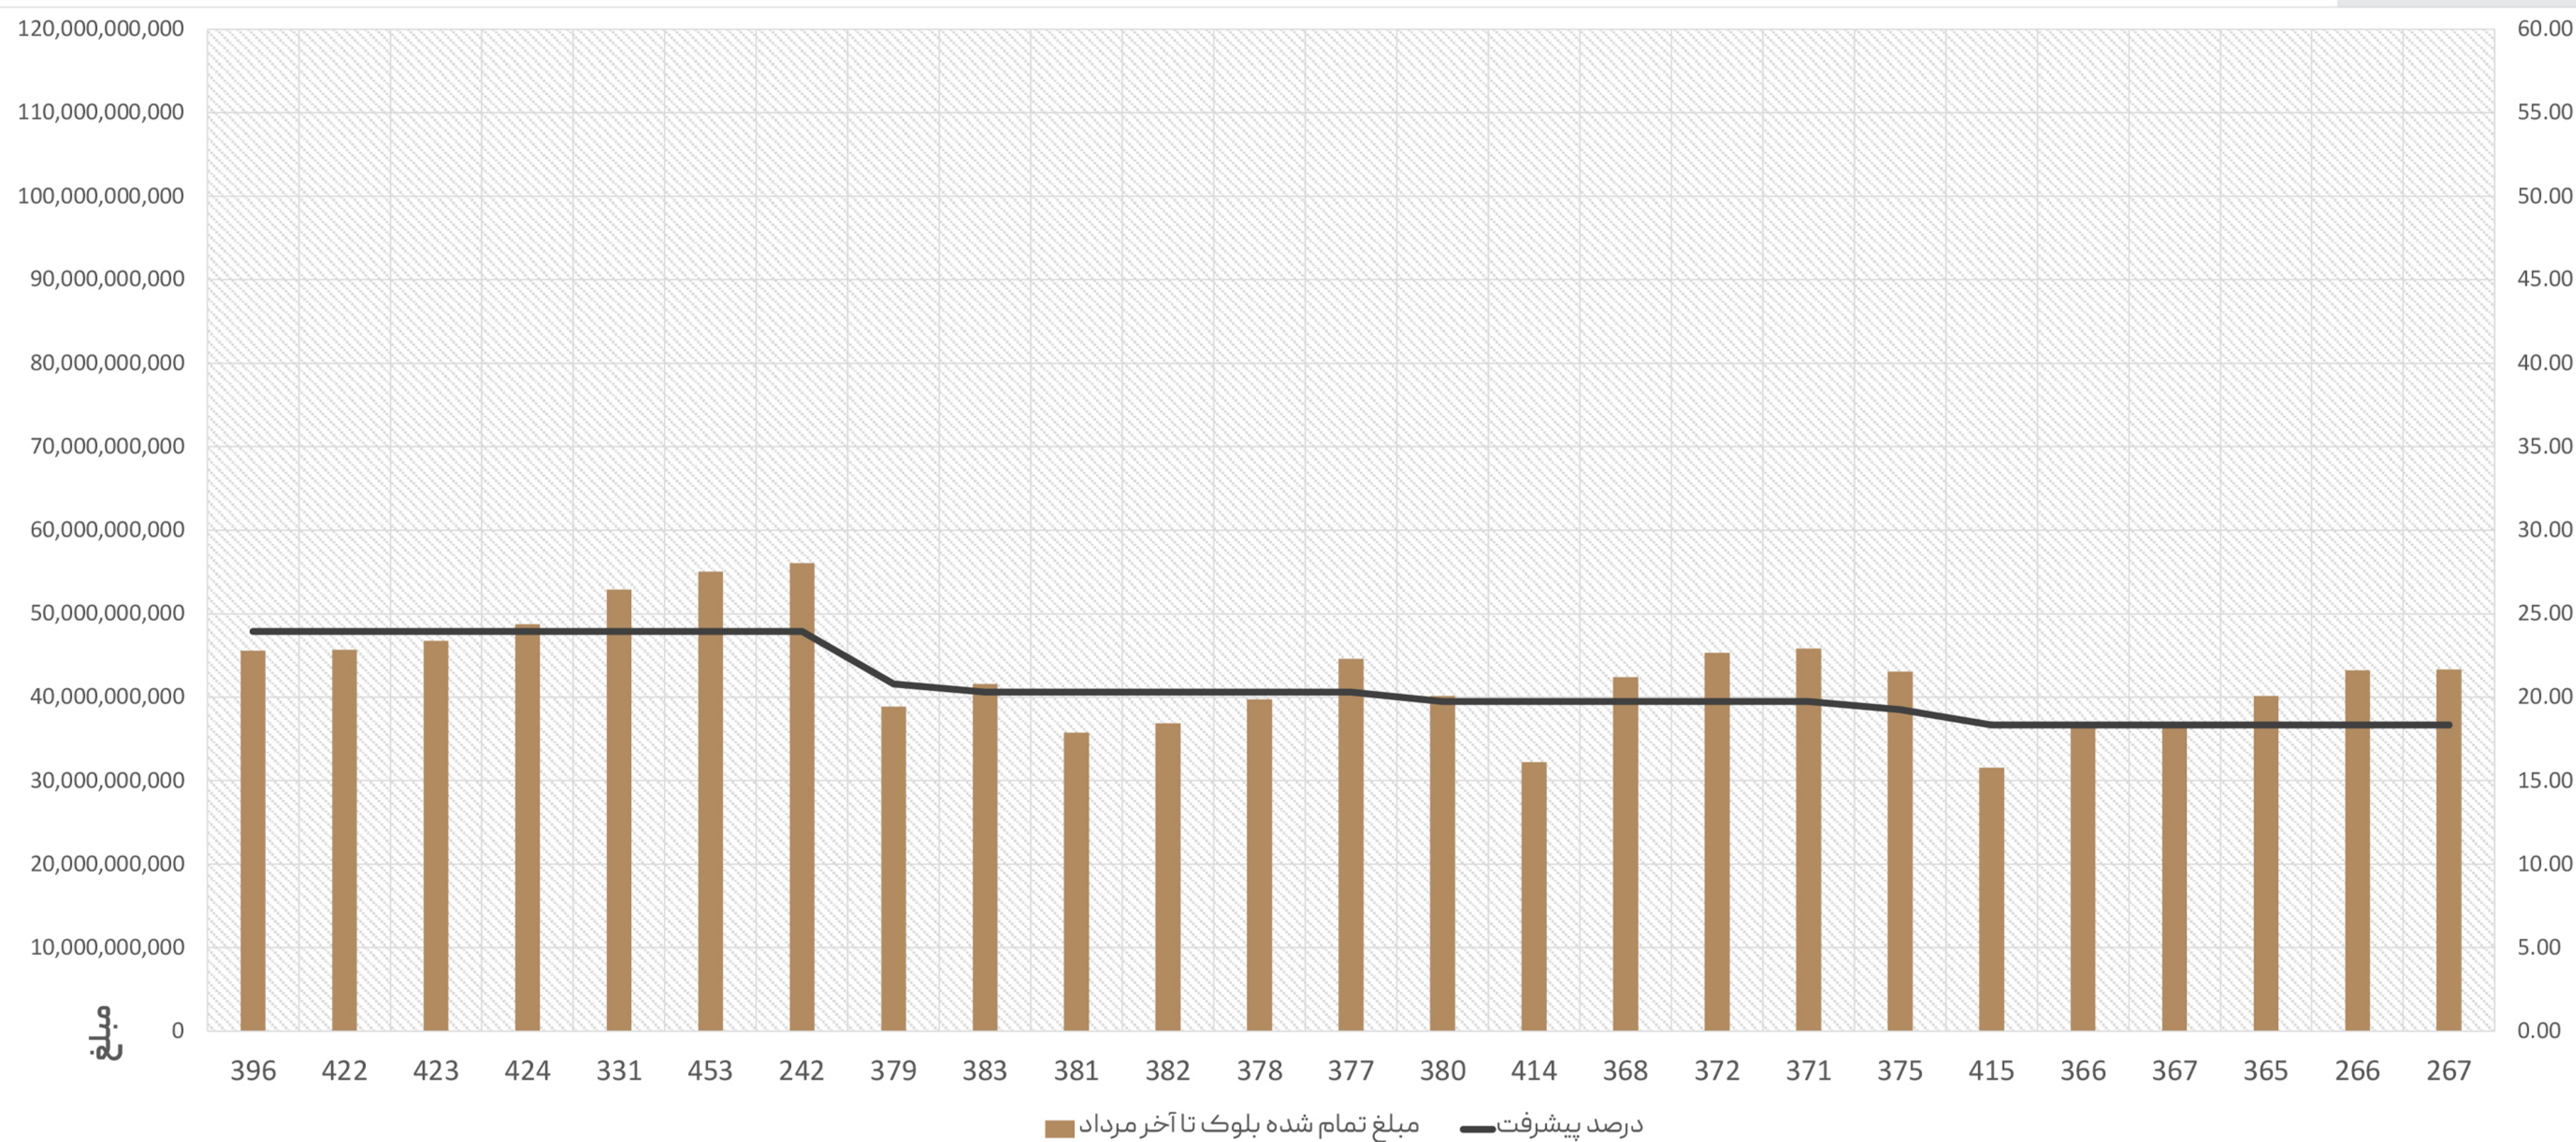




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

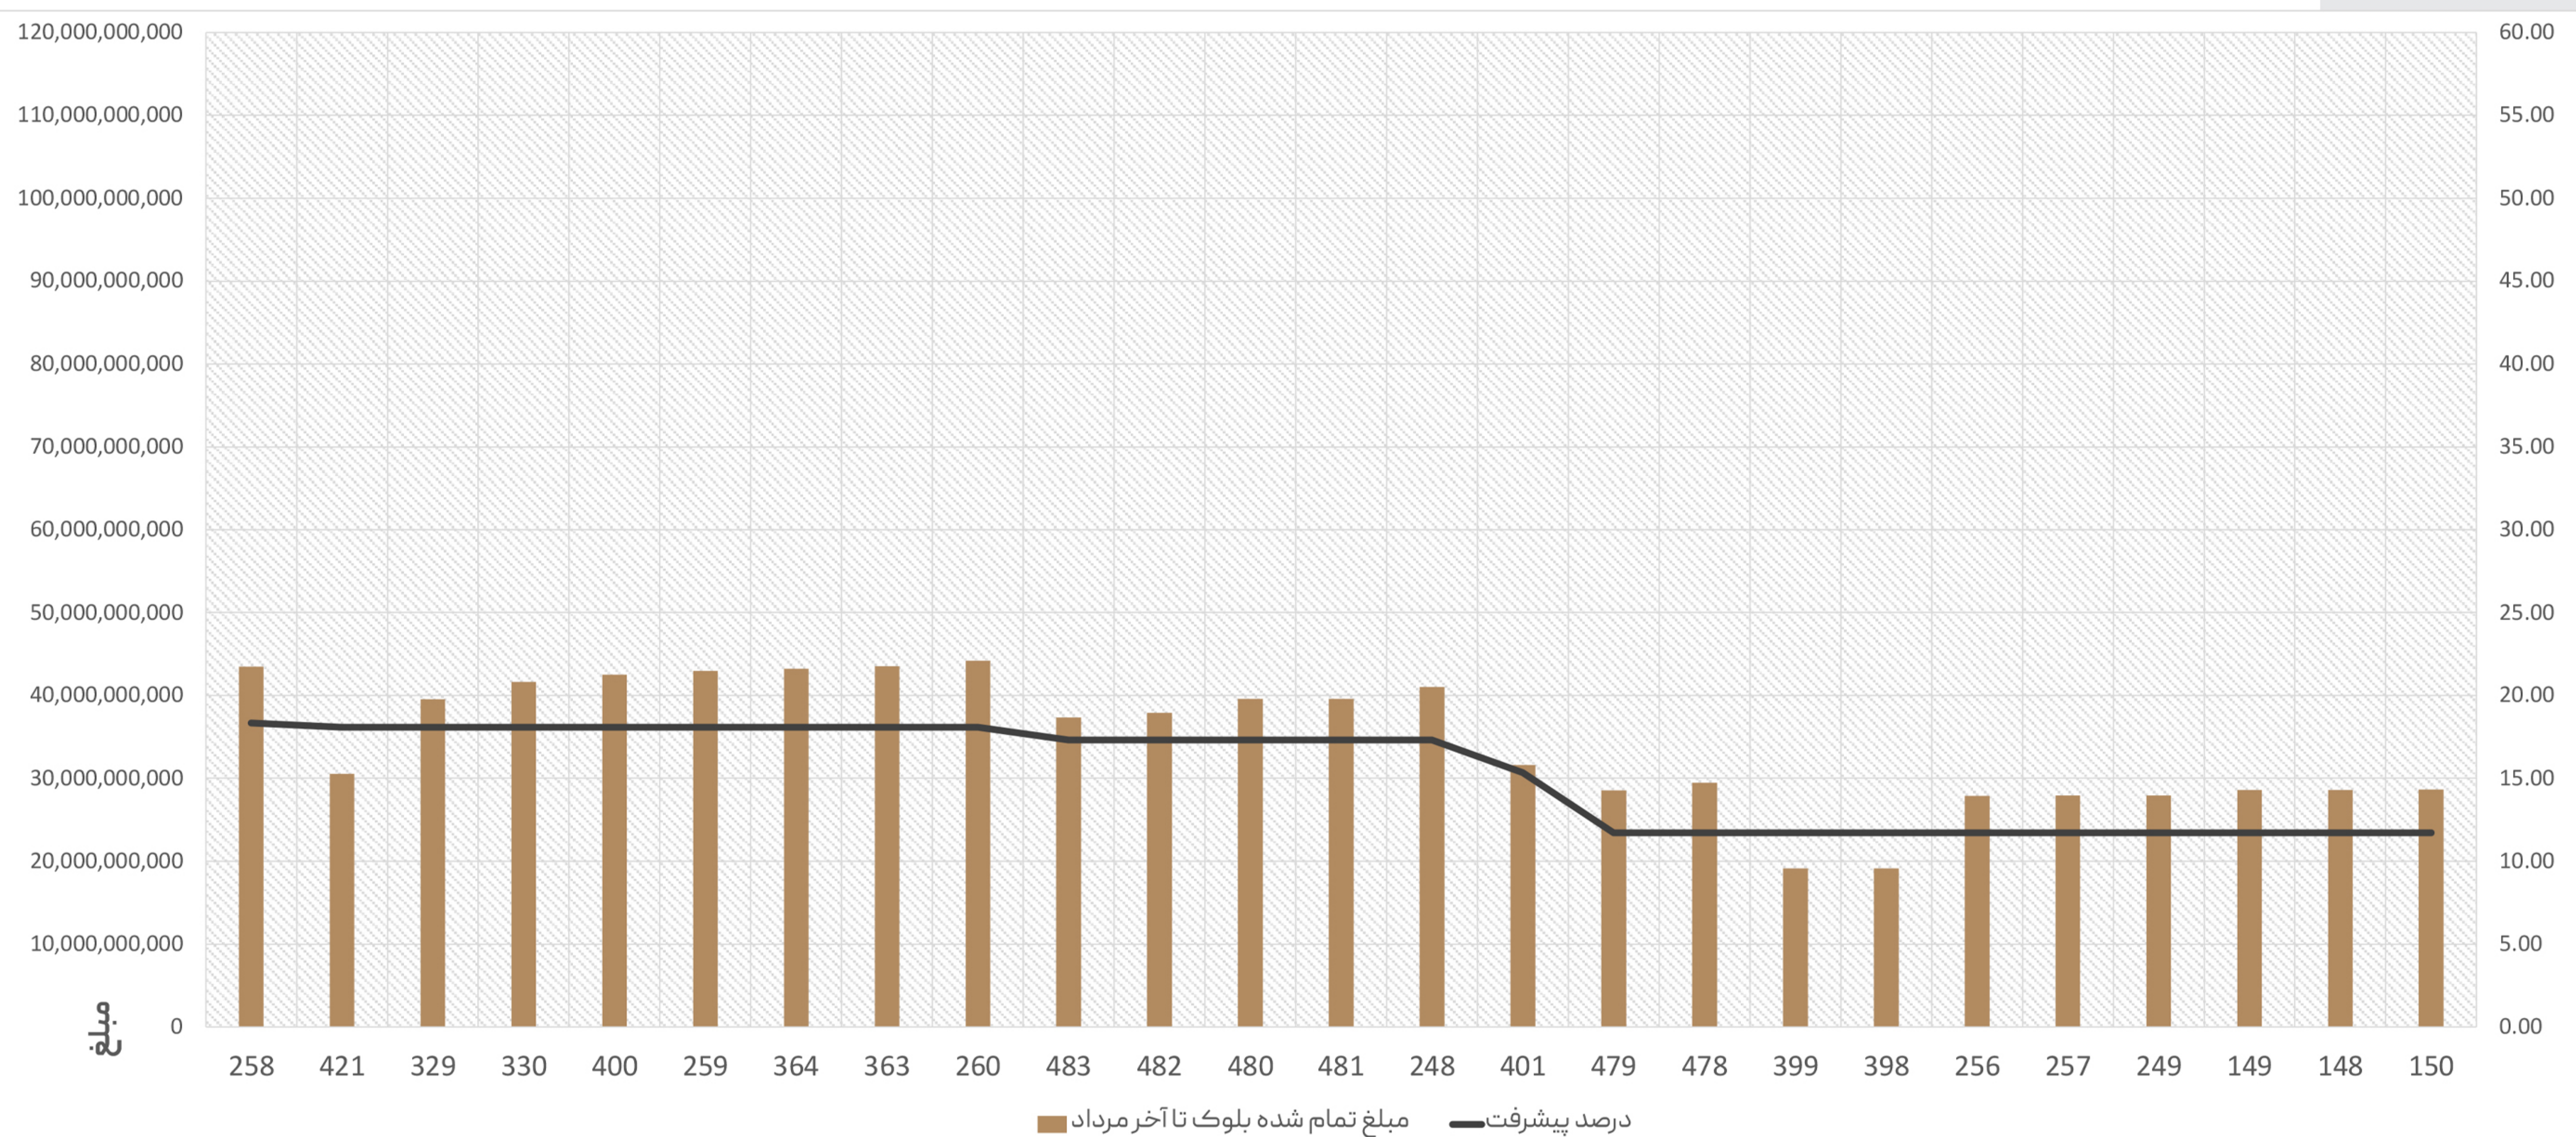




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

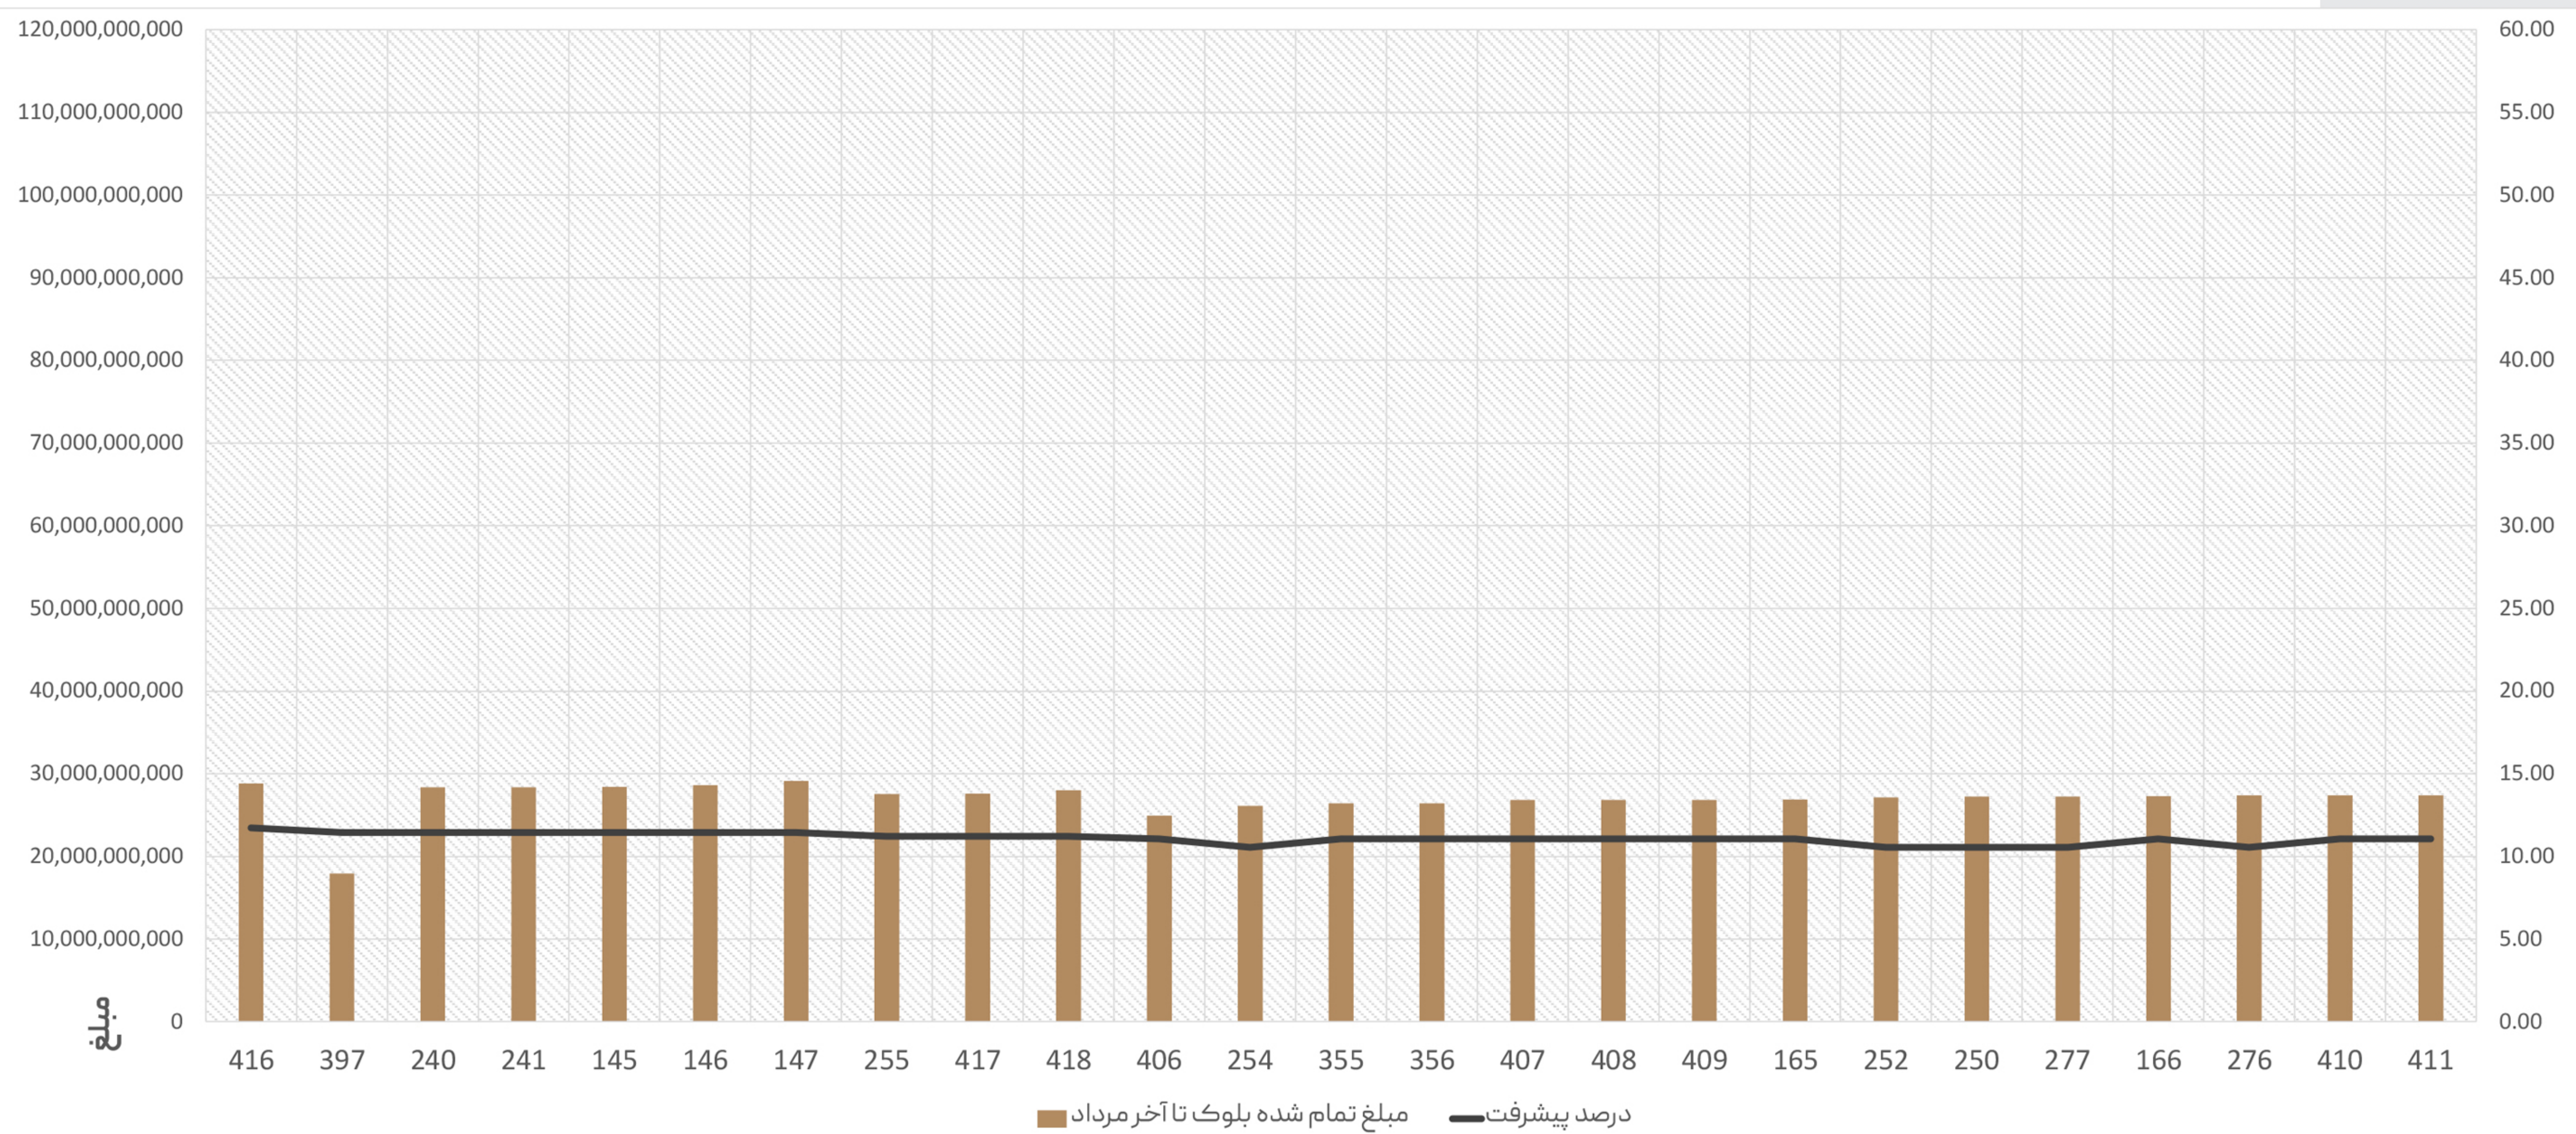




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

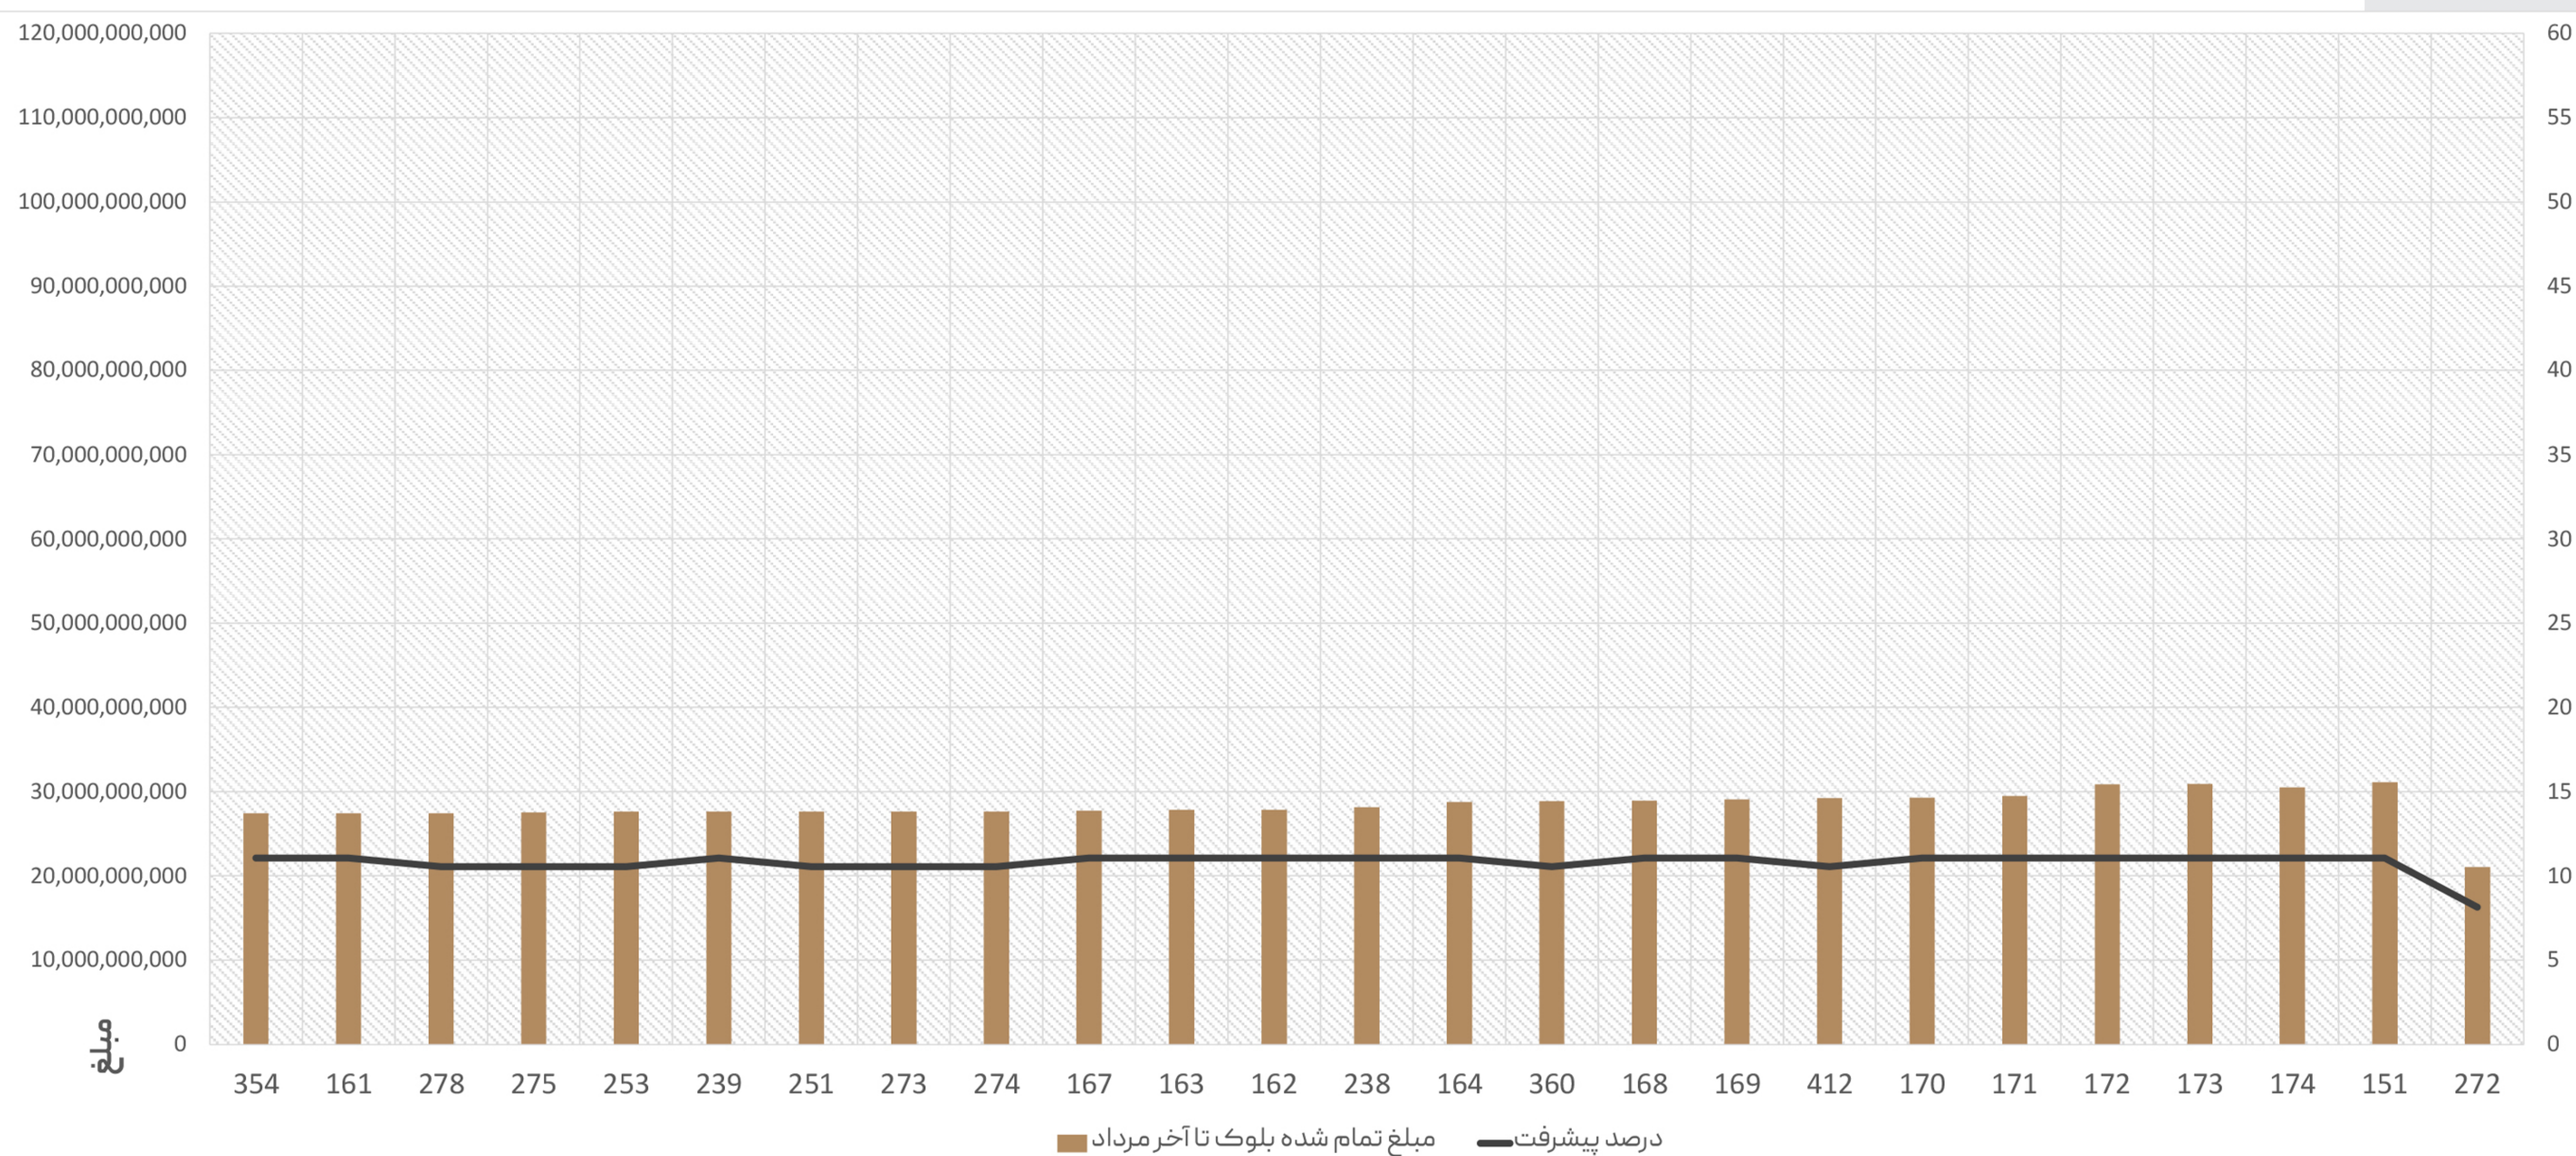




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

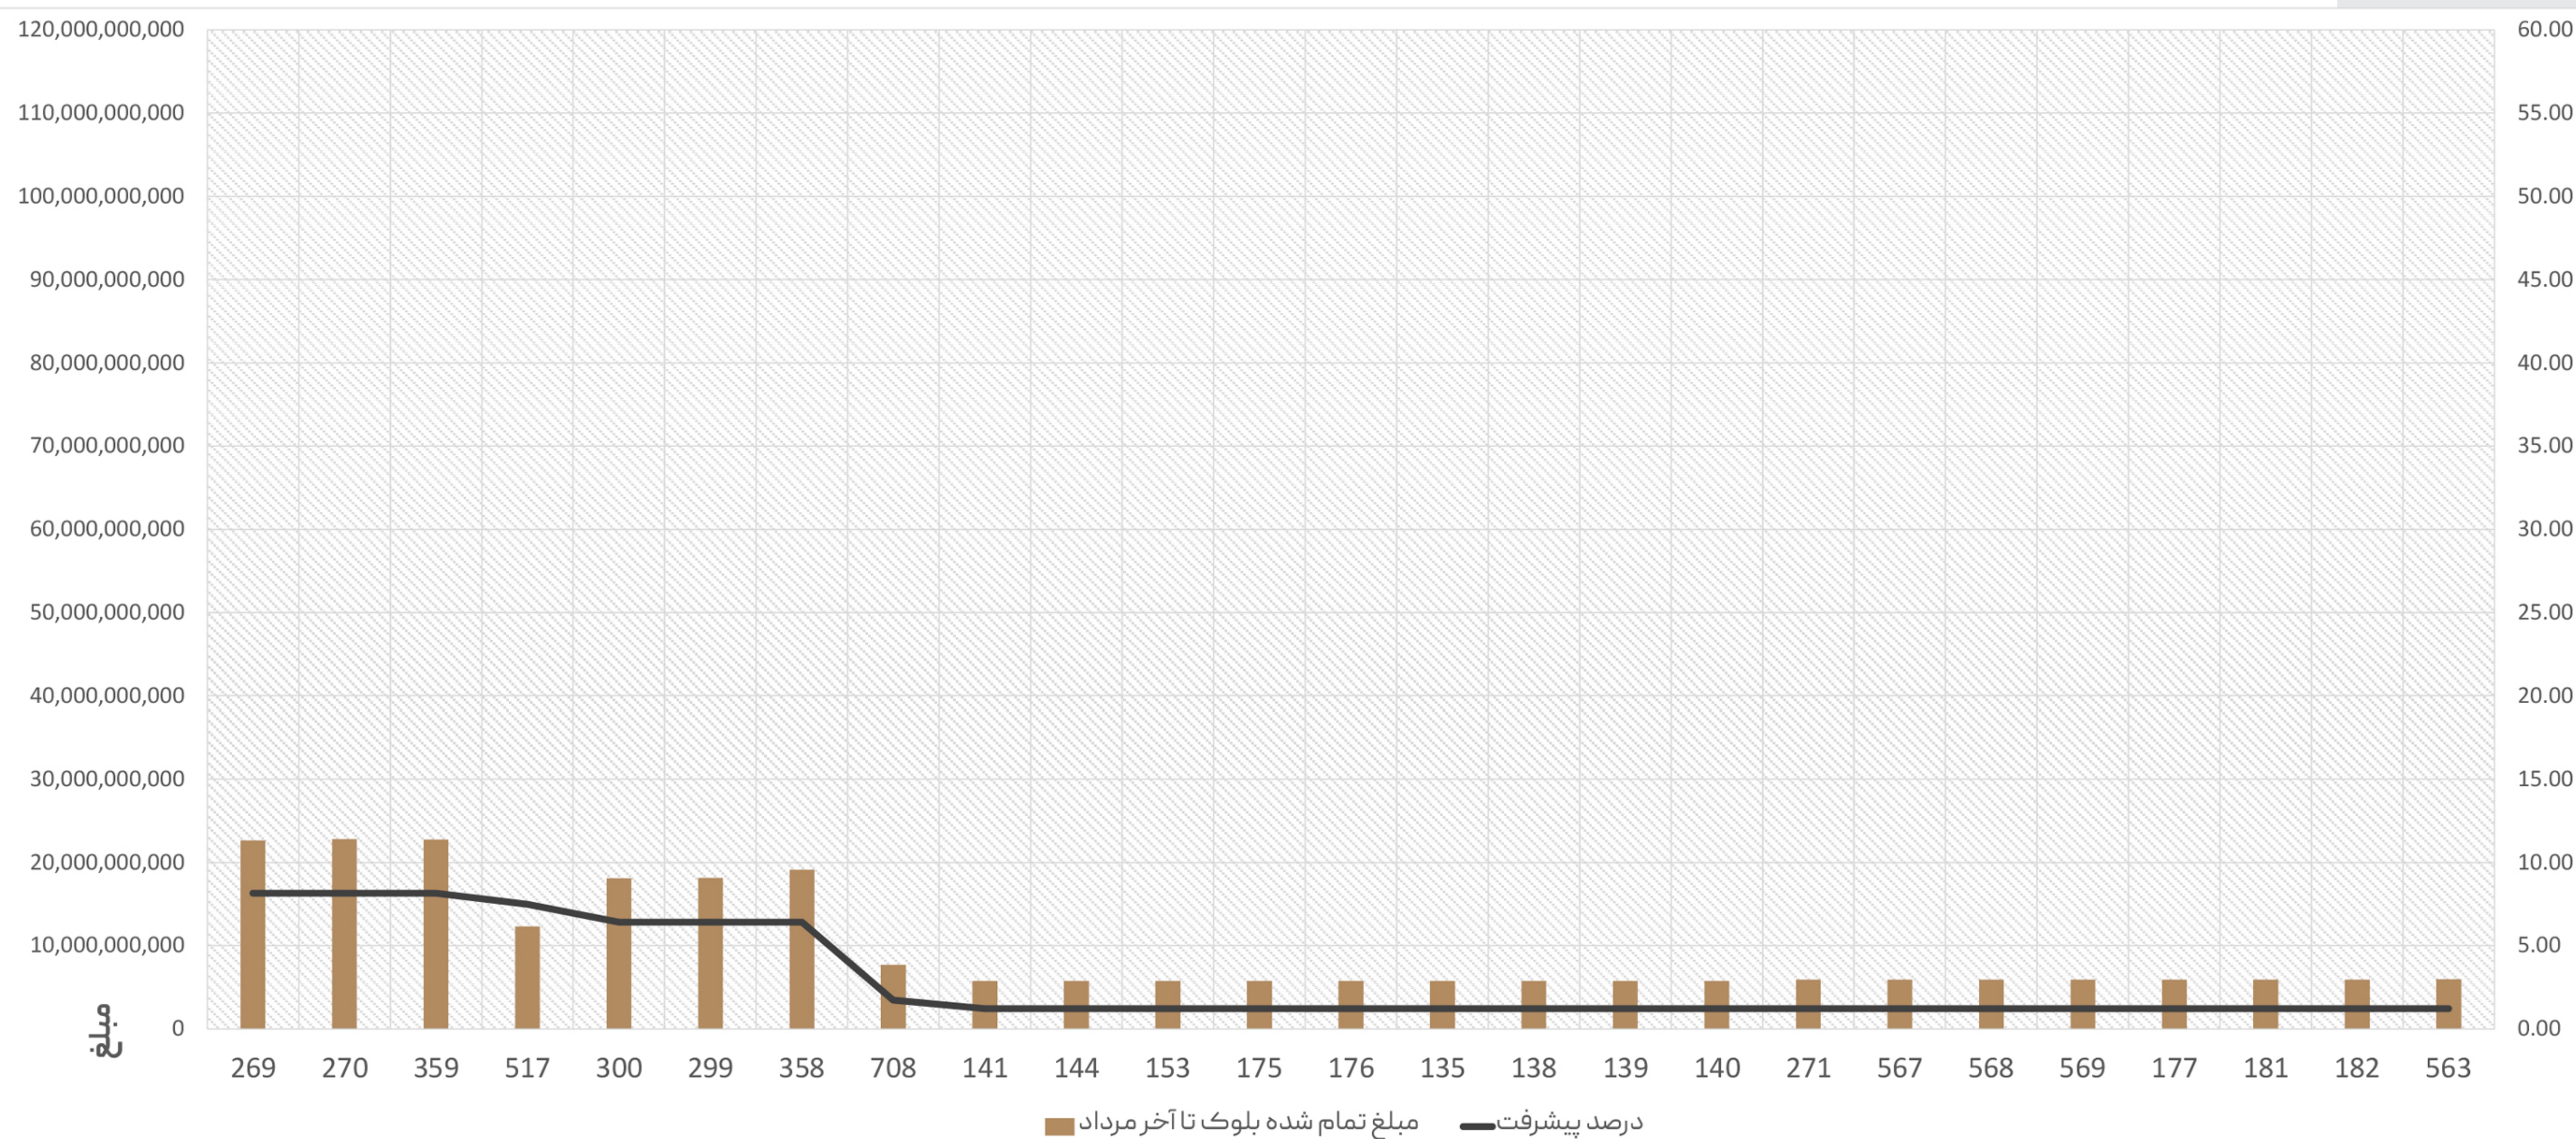




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

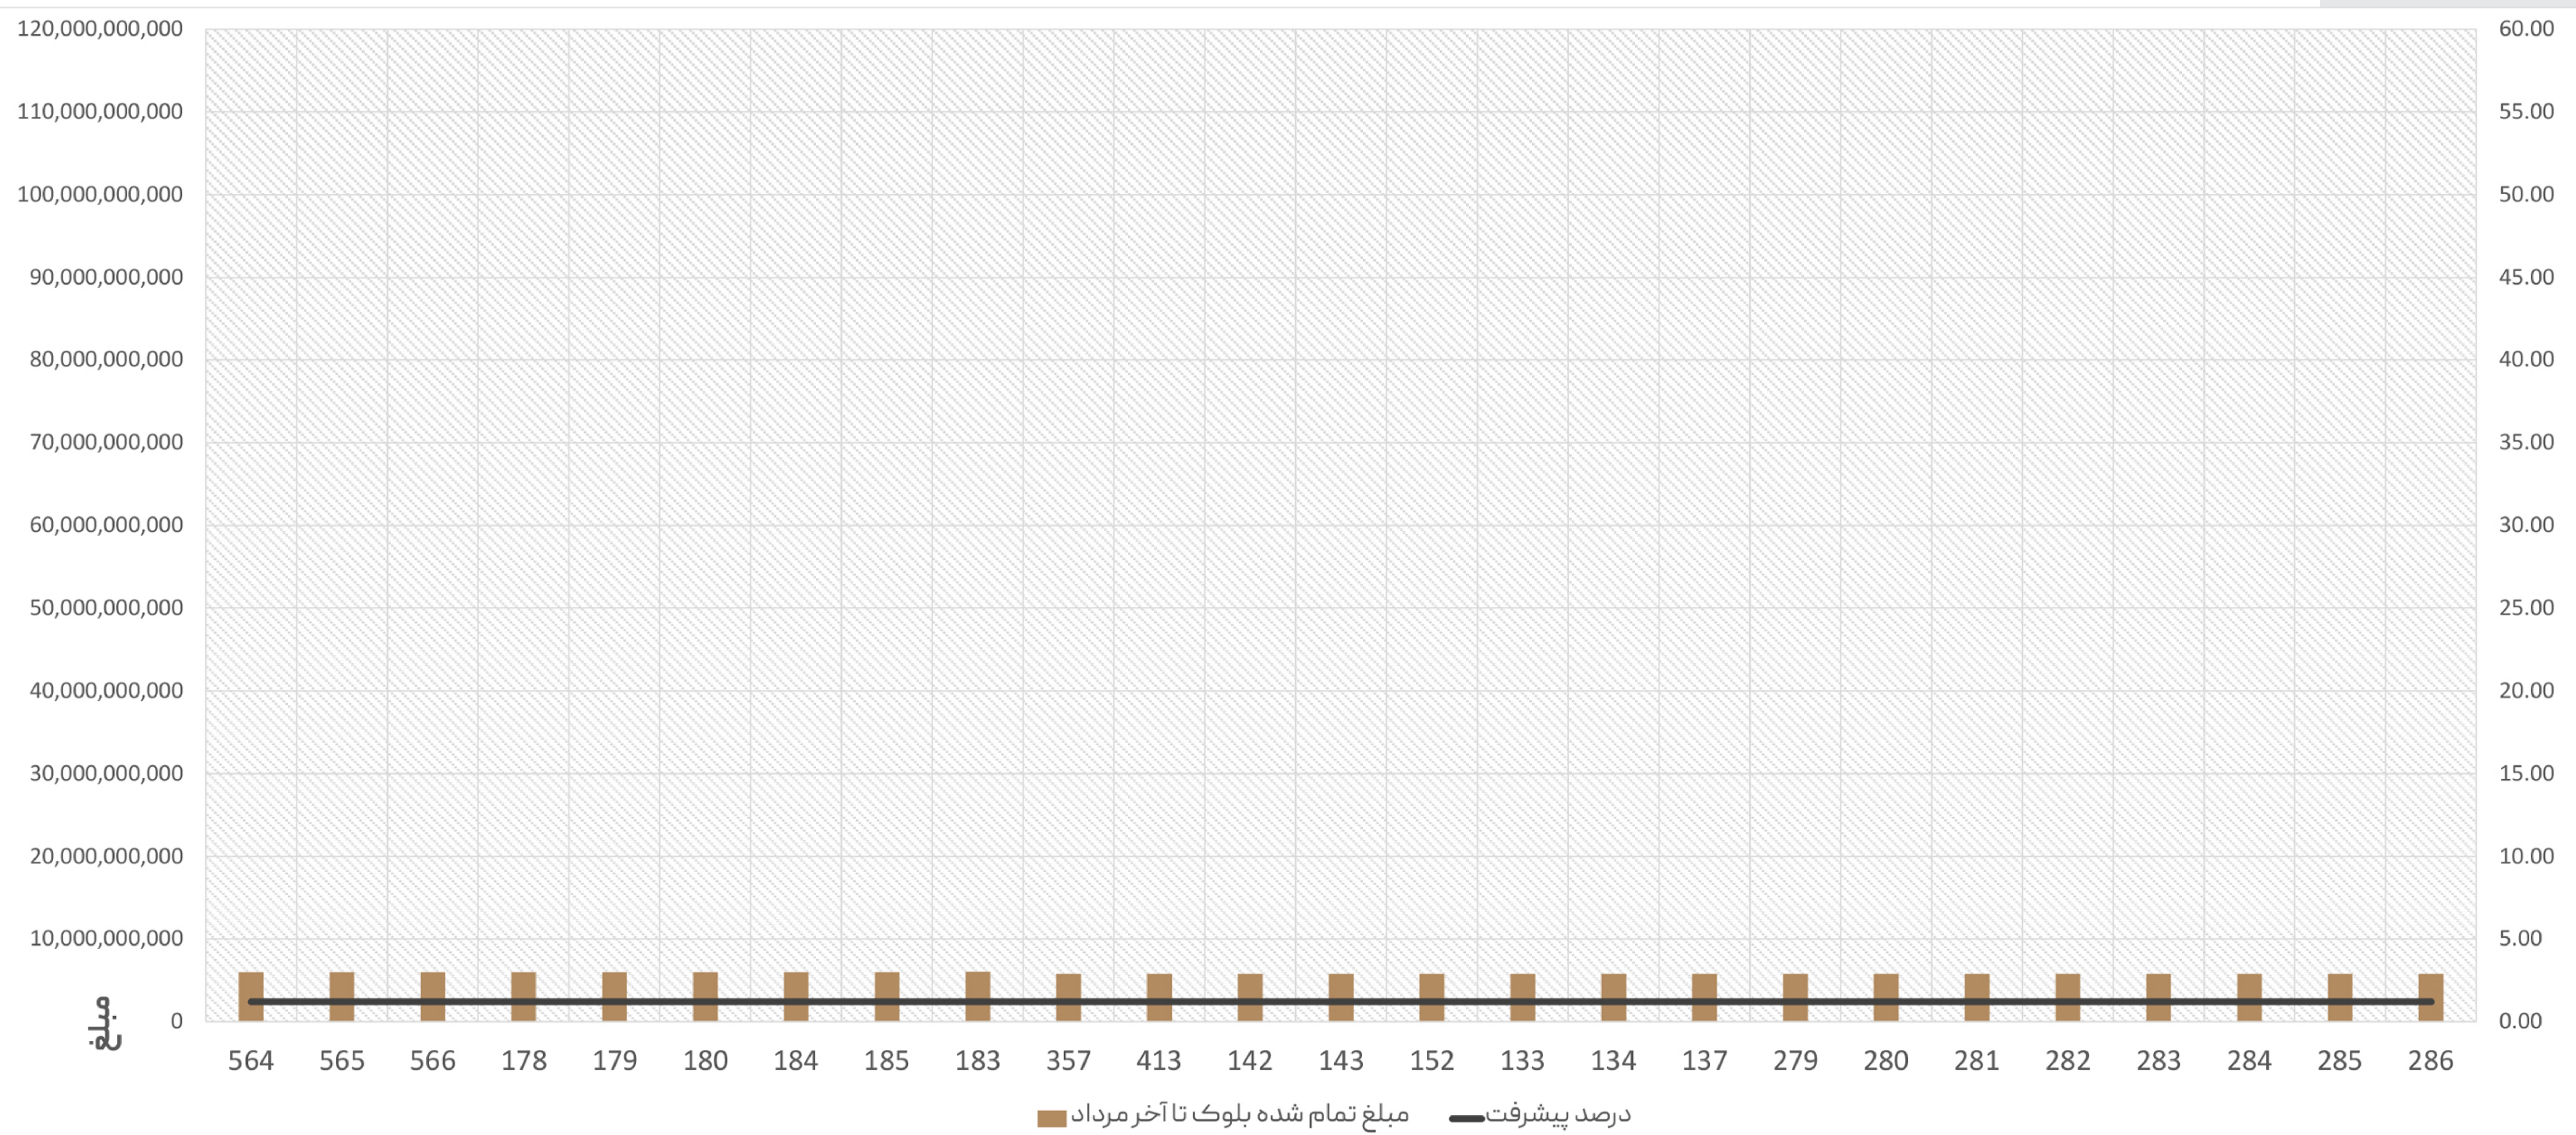




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

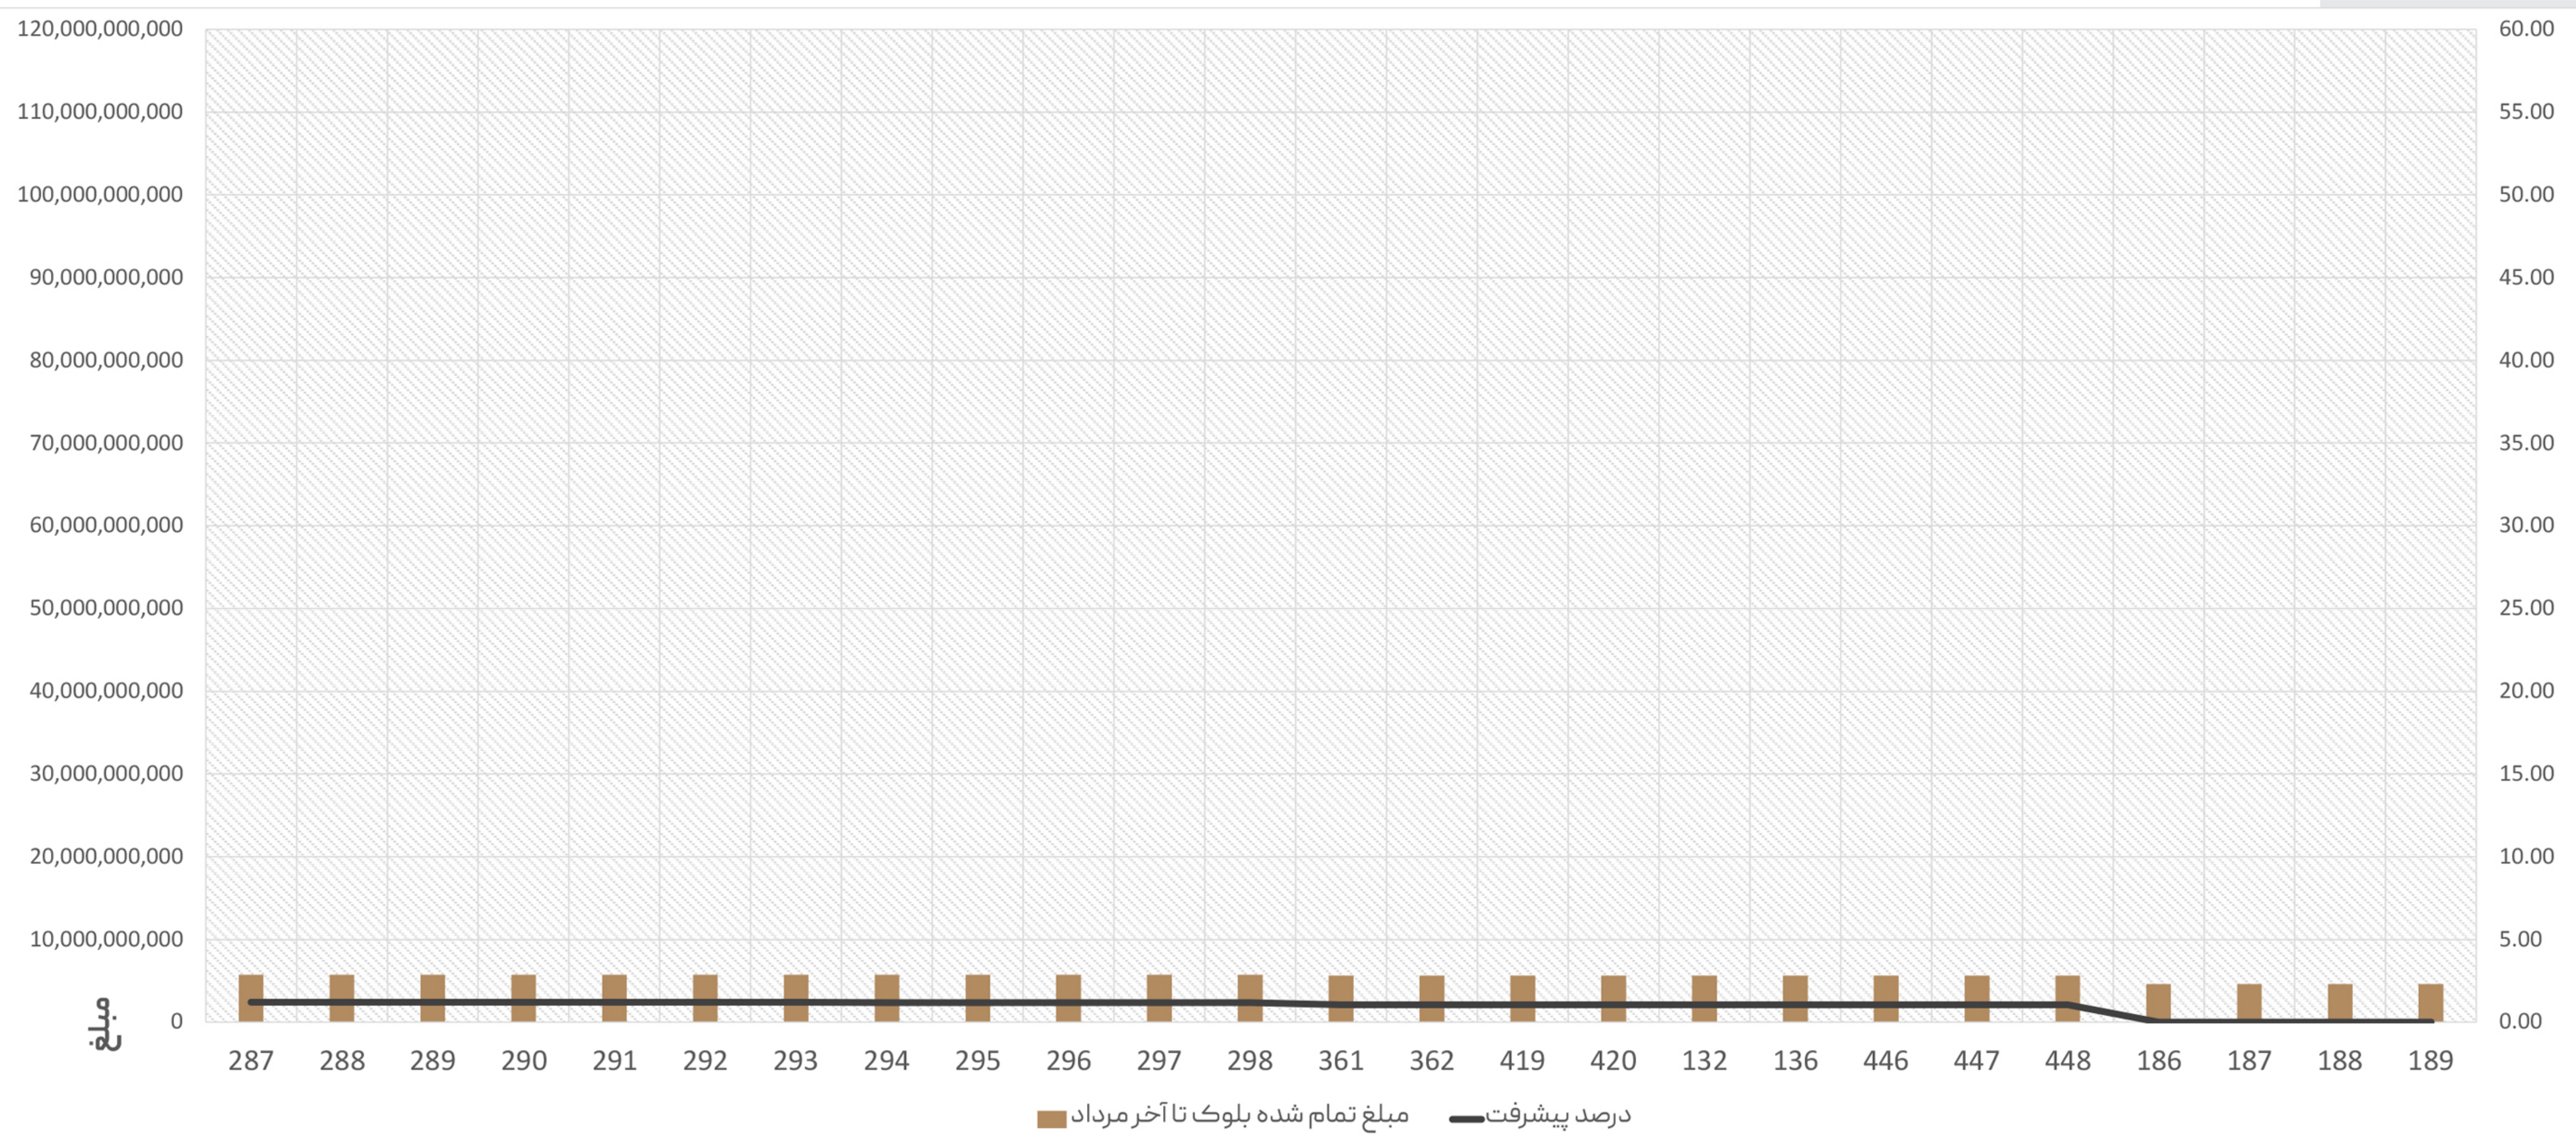




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

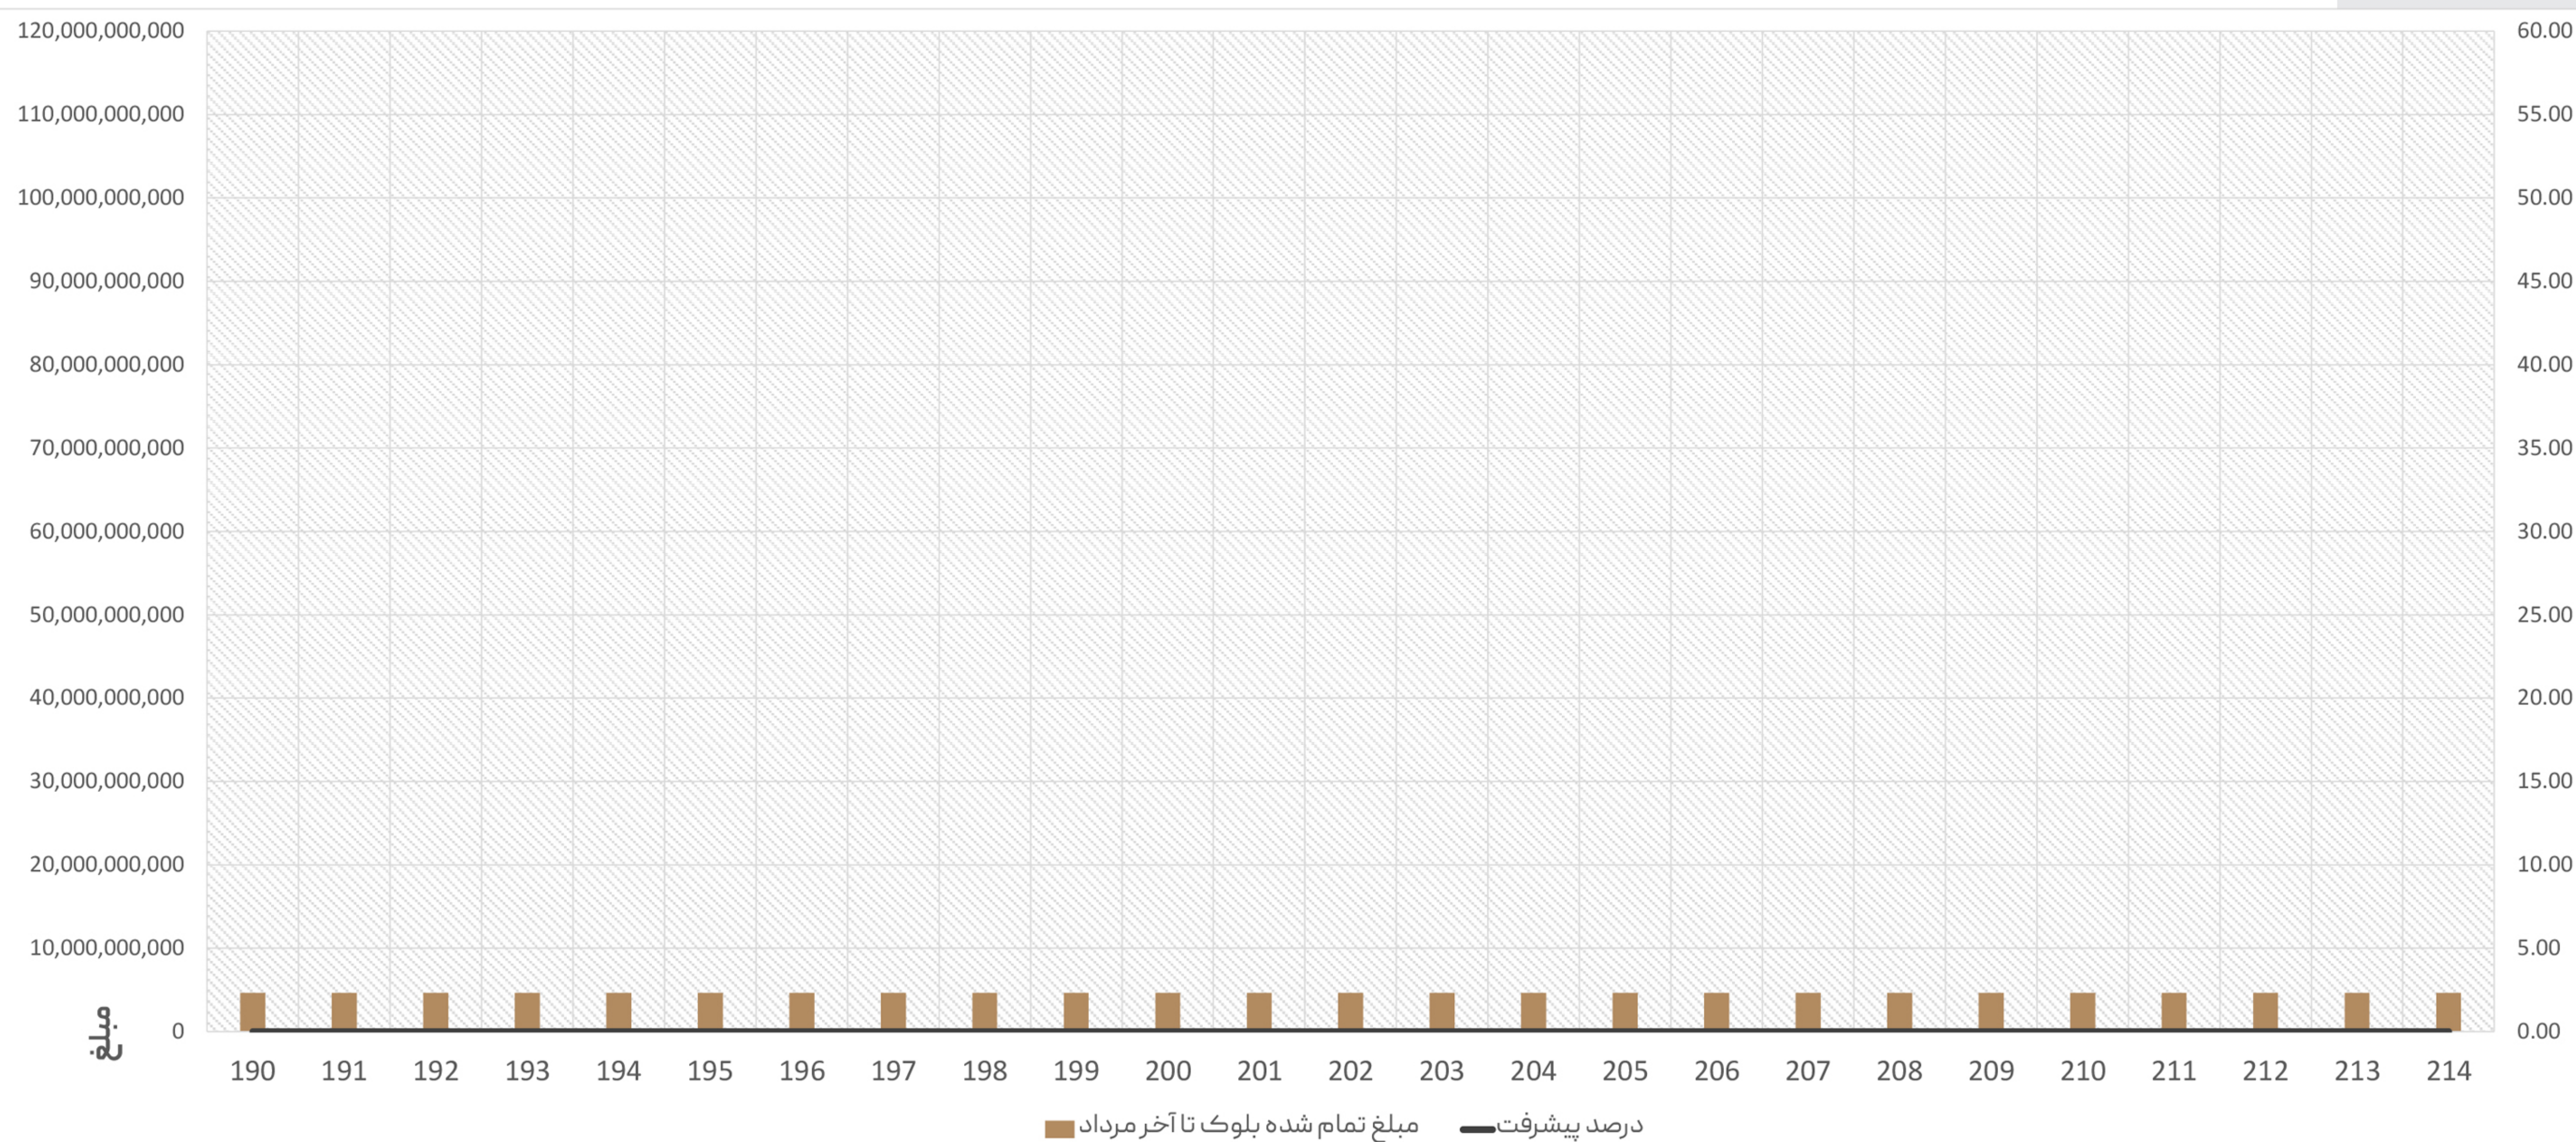




ریال - مبلغ تمام شده تا آخر مرداد

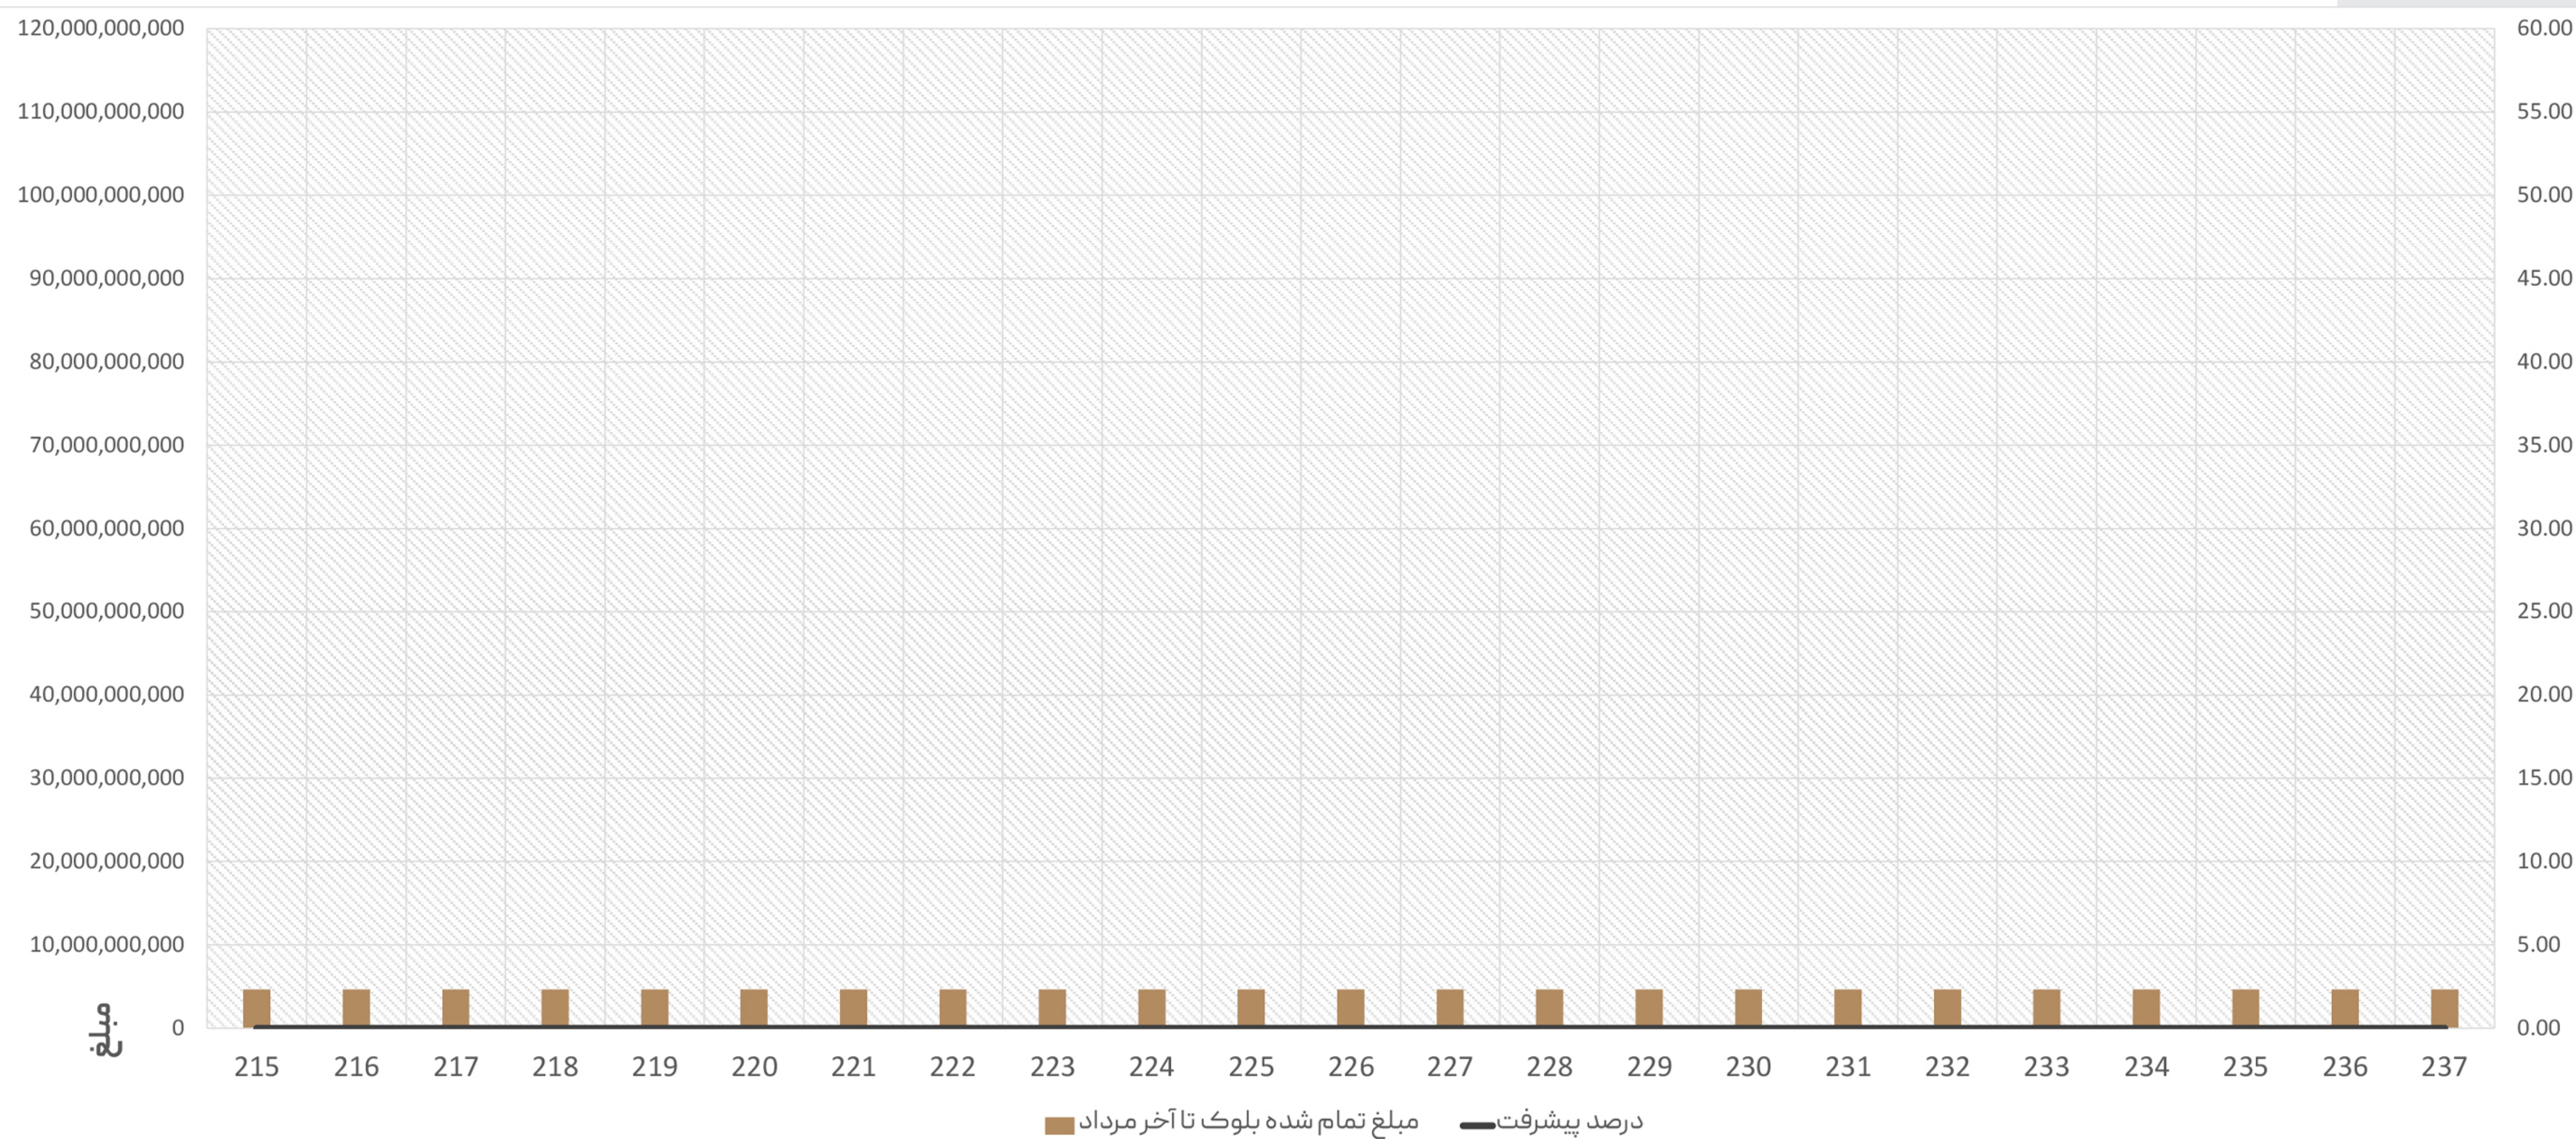




۰۲۱۹۱۶۹۲۵۲۴

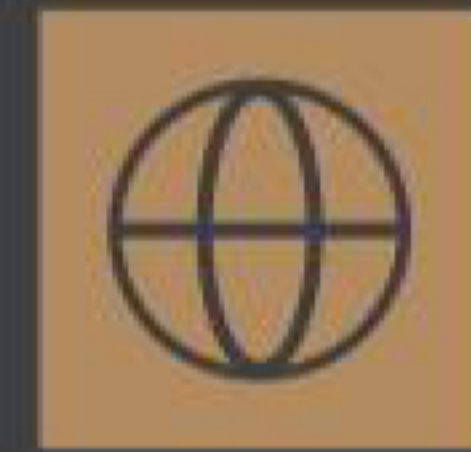


hosseinfirouzi.ir

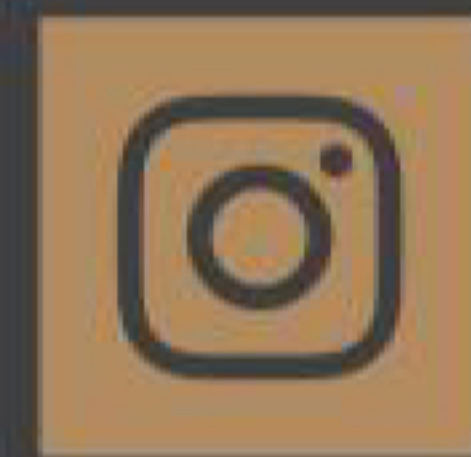

mhossein.firouzi



mhosseinfirouzi

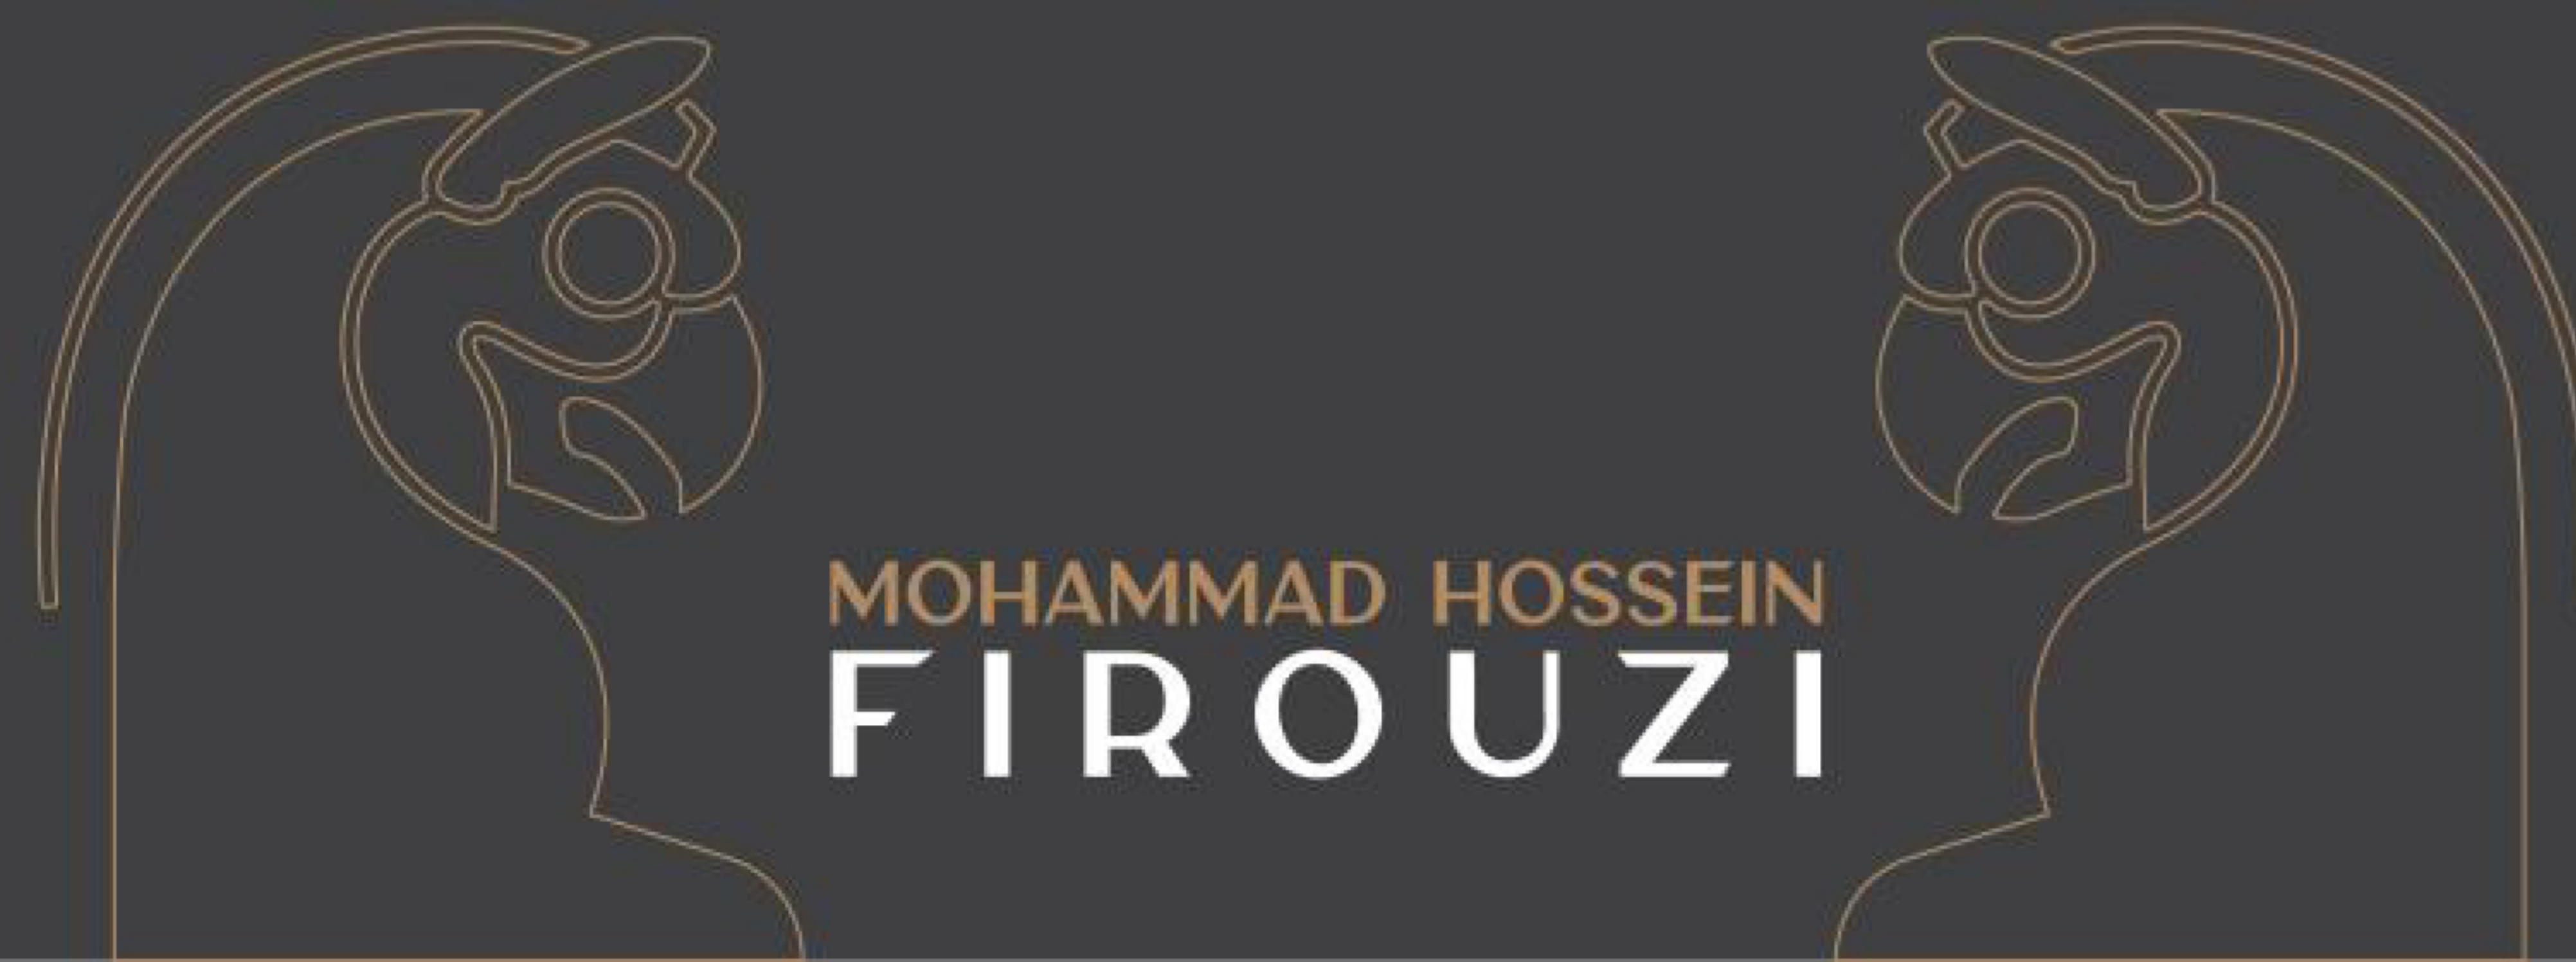

MOHAMMAD HOSSEIN
FIROUZI
