

اجرای طرح شمع

پروژه ۵۶۰ واحدی مسکن ملی فسا

هر متقاضی بر اساس رتبه خود، نام و موقعیت بلوک متعلق به خود را
تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ (با شاخص‌های موقت) مشاهده فرماید.



MOHAMMAD HOSSEIN
FIROUZI



بلوکِ شما

اعتبار هزینه ها تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵


رتبه	هزینه	نام بلوک
۱ تا ۳۲	۲۵۱,۱۹۴,۳۰۰,۰۲۶	بلوک A۳L
۳۳ تا ۶۴	۲۵۷,۴۲۲,۶۶۳,۱۵۵	بلوک A۴L
۶۵ تا ۸۰	۱۳۵,۷۰۹,۵۱۵,۶۷۷	بلوک A۵S
۸۱ تا ۱۱۲	۱۵۰,۰۹۴,۰۶۷,۳۰۸	بلوک A۶L
۱۱۳ تا ۱۴۴	۸۷,۵۳۱,۹۹۲,۱۶۹	بلوک A۶L
۱۴۵ تا ۱۷۶	۸۷,۱۹۵,۱۹۵,۵۲۰	بلوک AVL
۱۷۷ تا ۲۰۸	۸۹,۴۴۰,۱۷۳,۴۳۳	بلوک A۱L
۲۰۹ تا ۲۴۰	۱۰۱,۶۲۶,۷۶۸,۸۲۹	بلوک A۸L
۲۴۱ تا ۲۵۶	۴۲,۹۶۹,۷۷۰,۵۹۰	بلوک A۱۱S
۲۵۷ تا ۲۷۲	۴۳,۱۵۹,۰۷۲,۶۴۲	بلوک A۱۲S
۲۷۳ تا ۲۸۸	۴۶,۰۸۱,۰۴۳,۱۴۹	بلوک B۴S
۲۸۹ تا ۳۰۴	۴۸,۲۲۷,۷۴۵,۲۱۲	بلوک B۵S
۳۰۵ تا ۳۲۰	۴۷,۴۲۶,۳۸۲,۸۳۹	بلوک B۱S
۳۲۱ تا ۳۵۲	۸۸,۱۱۶,۶۵۲,۶۴۹	بلوک A۹L
۳۵۳ تا ۳۸۴	۹۰,۱۵۰,۶۲۴,۶۱۶	بلوک B۳L
۳۸۵ تا ۴۱۶	۹۶,۳۵۸,۰۵۰,۹۵۰	بلوک A۱۰L
۴۱۷ تا ۴۴۸	۹۴,۸۹۹,۱۱۴,۹۸۳	بلوک B۲L
۴۴۹ تا ۴۸۰	۱۰۱,۱۸۱,۵۵۱,۵۱۱	بلوک C۴L
۴۸۱ تا ۵۱۲	۳۰,۵۹۹,۰۸۹,۳۳۸	بلوک C۳L
۵۱۳ تا ۵۲۸	۱۵,۲۶۲,۵۶۶,۴۳۶	بلوک C۲S
۵۲۹ تا ۵۶۰	۲۲,۲۳۷,۲۸۷,۵۰۷	بلوک C۱L

گزارش هزینه کرد هر بلوک تا پایان خردادماه ۱۴۰۵

توجه : مبالغ تمام شده با توجه به شاخص های قطعی تعدیل تغییر می کنند!

ردیف	بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده هر بلوک تا آخر خرداد	قیمت هر واحد این بلوک	آخرین مرحله اجرایی	رتبه	1405-03
3	بلوک A3L	32	32.14	251,194,300,026	7,849,821,876	کیورینگ بتن سقف طبقه دوم - دیوار چینی کامل طبقه همکف	1	32
4	بلوک A4L	32	31.79	257,422,663,155	8,044,458,224	کیورینگ بتن سقف طبقه دوم - دیوار چینی نیمه طبقه همکف	33	64
5	بلوک A5S	16	32.35	135,709,515,677	8,481,844,730	آرماتوربندی ستون طبقه سوم - دیوار چینی نیمه طبقه همکف	65	80
2	بلوک A2L	32	17.97	150,094,067,308	4,690,439,603	آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه اول	81	112
7	بلوک A7L	32	11.62	87,195,195,520	2,724,849,860	کیورینگ بتن ستون و دیوار برشی همکف	113	144
6	بلوک A6L	32	11.62	87,531,992,169	2,735,374,755	کیورینگ بتن ستون و دیوار برشی همکف	145	176
10	بلوک A10L	32	11.62	96,358,050,950	3,011,189,092	کیورینگ بتن ستون و دیوار برشی همکف	177	208
8	بلوک A8L	32	11.62	101,626,768,829	3,175,836,526	کیورینگ بتن ستون و دیوار برشی همکف	209	240
1	بلوک A1L	32	11.16	89,440,173,433	2,795,005,420	آرماتوربندی کامل ستون و دیوار برشی همکف	241	272
11	بلوک A11S	16	10.97	42,969,770,590	2,685,610,662	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	273	288
12	بلوک A12S	16	10.97	43,159,072,642	2,697,442,040	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	289	304
9	بلوک A9L	32	10.97	88,116,652,649	2,753,645,395	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	305	336
15	بلوک B3L	32	10.97	90,150,624,616	2,817,207,019	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	337	368
16	بلوک B4S	16	10.97	46,081,043,149	2,880,065,197	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	369	384
13	بلوک B1S	16	10.97	47,426,382,839	2,964,148,927	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	385	400
14	بلوک B2L	32	10.97	94,899,114,983	2,965,597,343	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	401	432
17	بلوک B5S	16	10.97	48,227,745,212	3,014,234,076	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	433	448
21	بلوک C4L	32	10.97	101,181,551,511	3,161,923,485	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	449	480
20	بلوک C3L	32	1.21	30,599,089,338	956,221,542	بان مگر	481	512
19	بلوک C2S	16	1.03	15,262,566,436	953,910,402	پی کلی	513	528
18	بلوک C1L	32	0.01	22,237,287,507	694,915,235	پایه کردن	529	560
		560	12.99	1,926,883,628,537			1	560

نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۵۶۰ واحدی

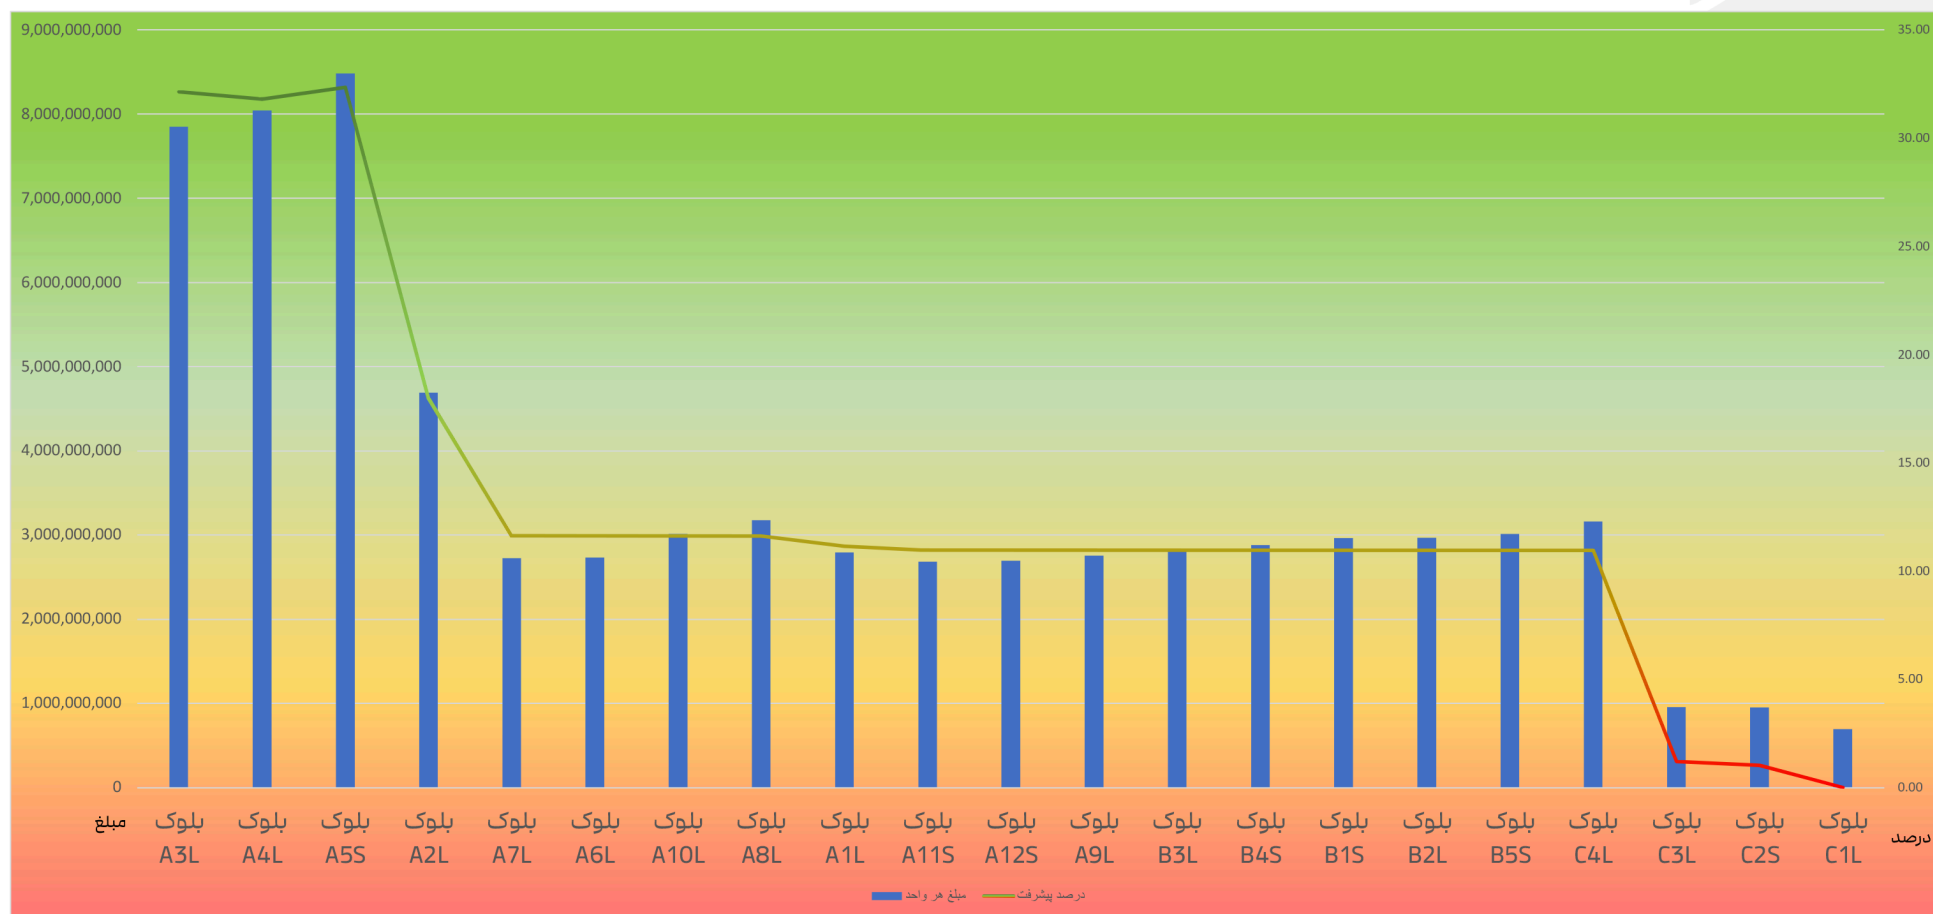



۰۲۱۹۱۶۹۲۵۲۴



hosseinfirouzi.ir



mhossein.firouzi



mhosseinfirouzi

